

令和８年９月３０日現在

松波漁港 （まつなみ）	漁港番号	種　別	所管	管 理 者	施工場所
	2420050	第2種	本土	能 登 町	石川県鳳珠郡能登町字松波

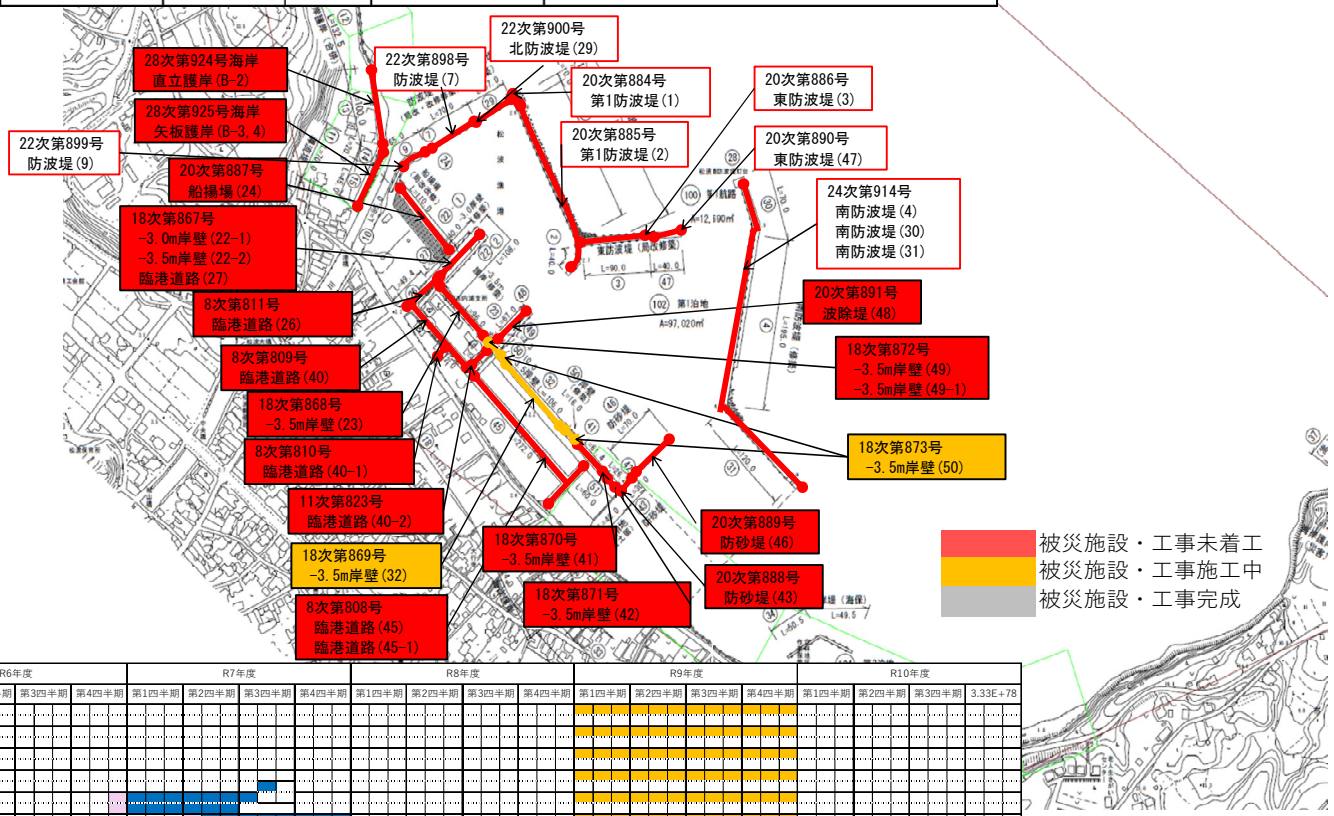


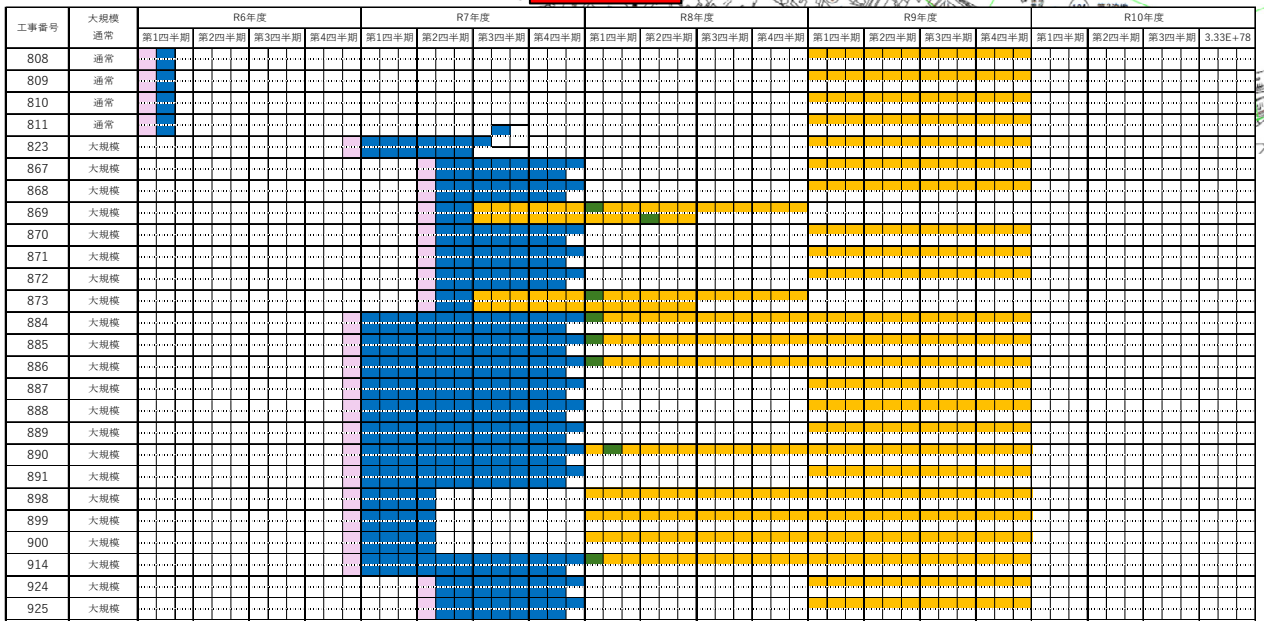

令和８年９月３０日現在

比那漁港（びな）	漁港番号	種　別	所管	管理者	施工場所
	2410300	第1種	本土	能登町	石川県鳳珠郡能登町字布浦

S＝1：5000

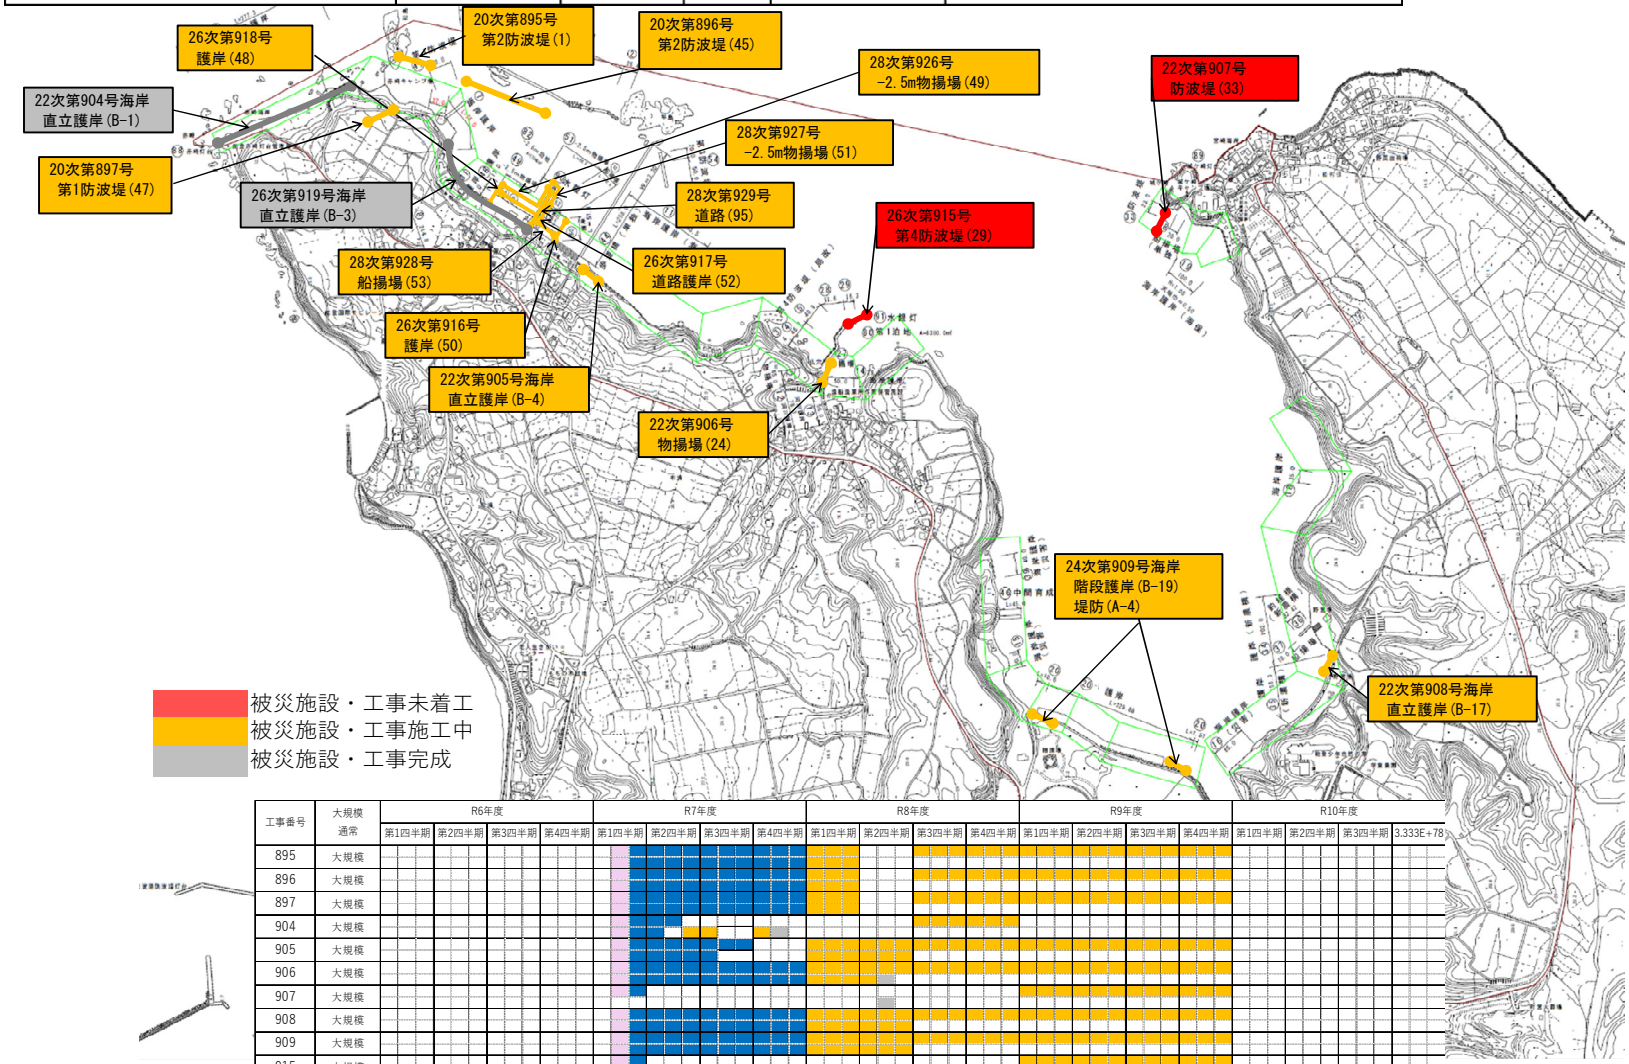


工事番号	大規模通常	R6年度				R7年度				R8年度				R9年度				R10年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	3.333E+78
895	大規模																				
896	大規模																				
897	大規模																				
904	大規模																				
905	大規模																				
906	大規模																				
907	大規模																				
908	大規模																				
909	大規模																				
915	大規模																				
916	大規模																				
917	大規模																				
918	大規模																				
919	大規模																				
926	大規模																				
927	大規模																				
928	大規模																				
929	大規模																				

測量・調査　地質調査　設計　工事
上段：予定　下段：実績　変更協議
被災施設・工事未着工　被災施設・工事施工中　被災施設・工事完成
測量・調査実績　地質調査実績　設計実績　工事実績（契約済み）

白丸漁港 （しろまる）	漁港番号	種　別	所管	管理者	施工場所
	2410290	第1種	本土	能登町	石川県鳳珠郡能登町字白丸

令和８年９月３０日現在

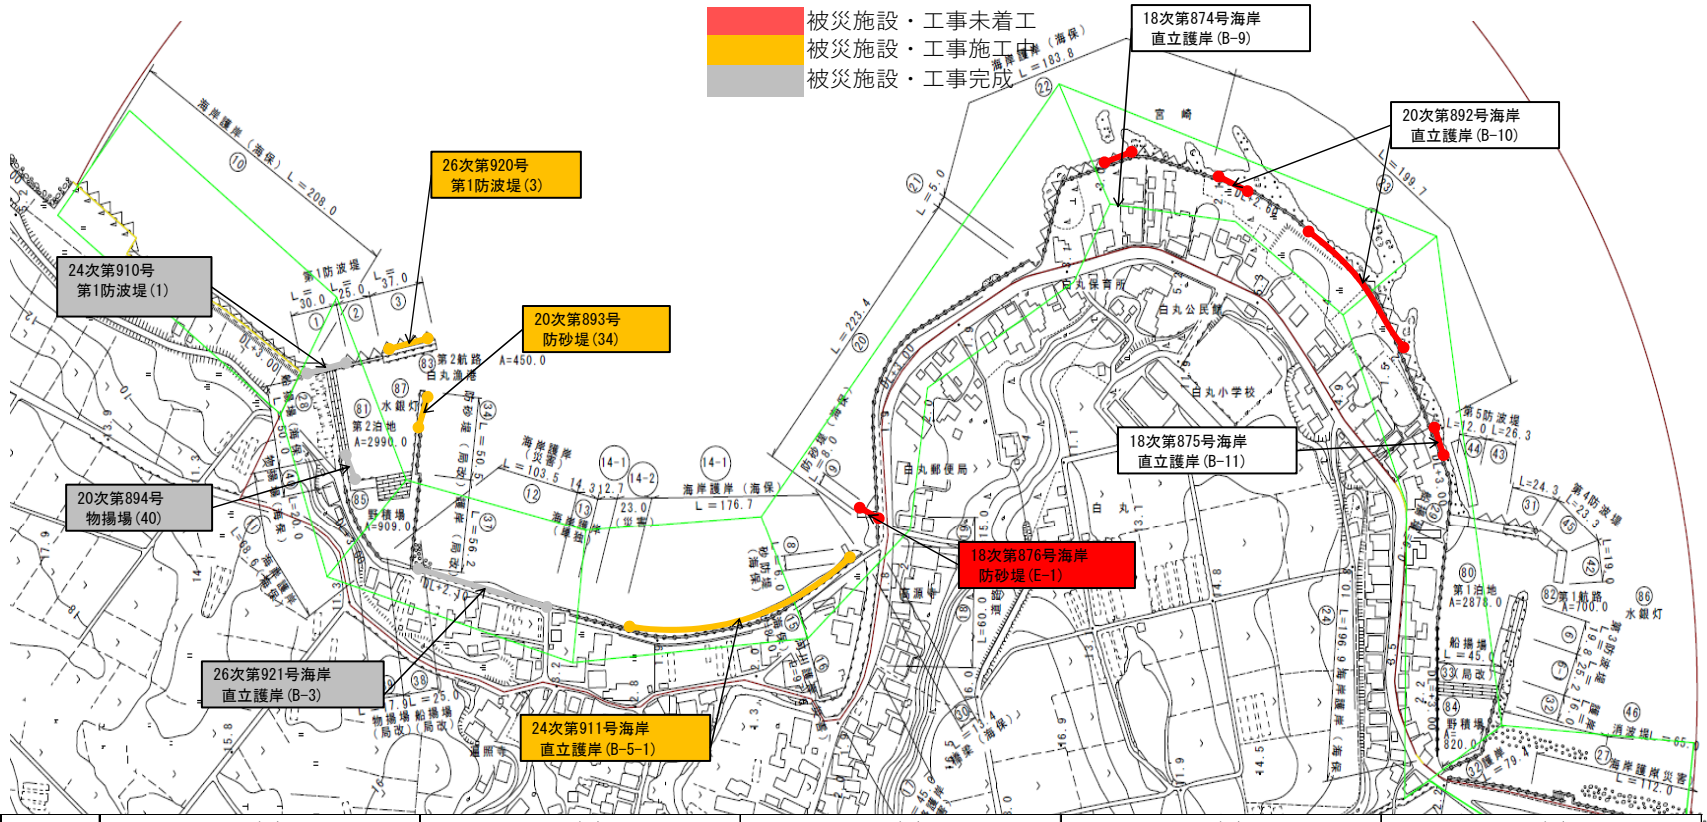

工事番号	大規模 通常	R6年度				R7年度				R8年度				R9年度				R10年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	3.33E+78
874	大規模																				
875	大規模																				
876	大規模																				
892	大規模																				
893	大規模									比那と併せて											
894	大規模																				
910	大規模																				
911	大規模																				
920	大規模									比那と併せて											
921	大規模																				

測量・調査
地質調査
設計
工事


上段：予定
下段：実績
変更協議

被災施設・工事未着工
被災施設・工事施工中
被災施設・工事完成

測量・調査実績
地質調査実績
設計実績
工事実績（契約済み）

小浦漁港 （おうら）	漁港番号	種　別	所管	管理者	施工場所
	2410270	第1種	本土	能登町	石川県鳳珠郡能登町字小浦

令和８年９月３０日現在

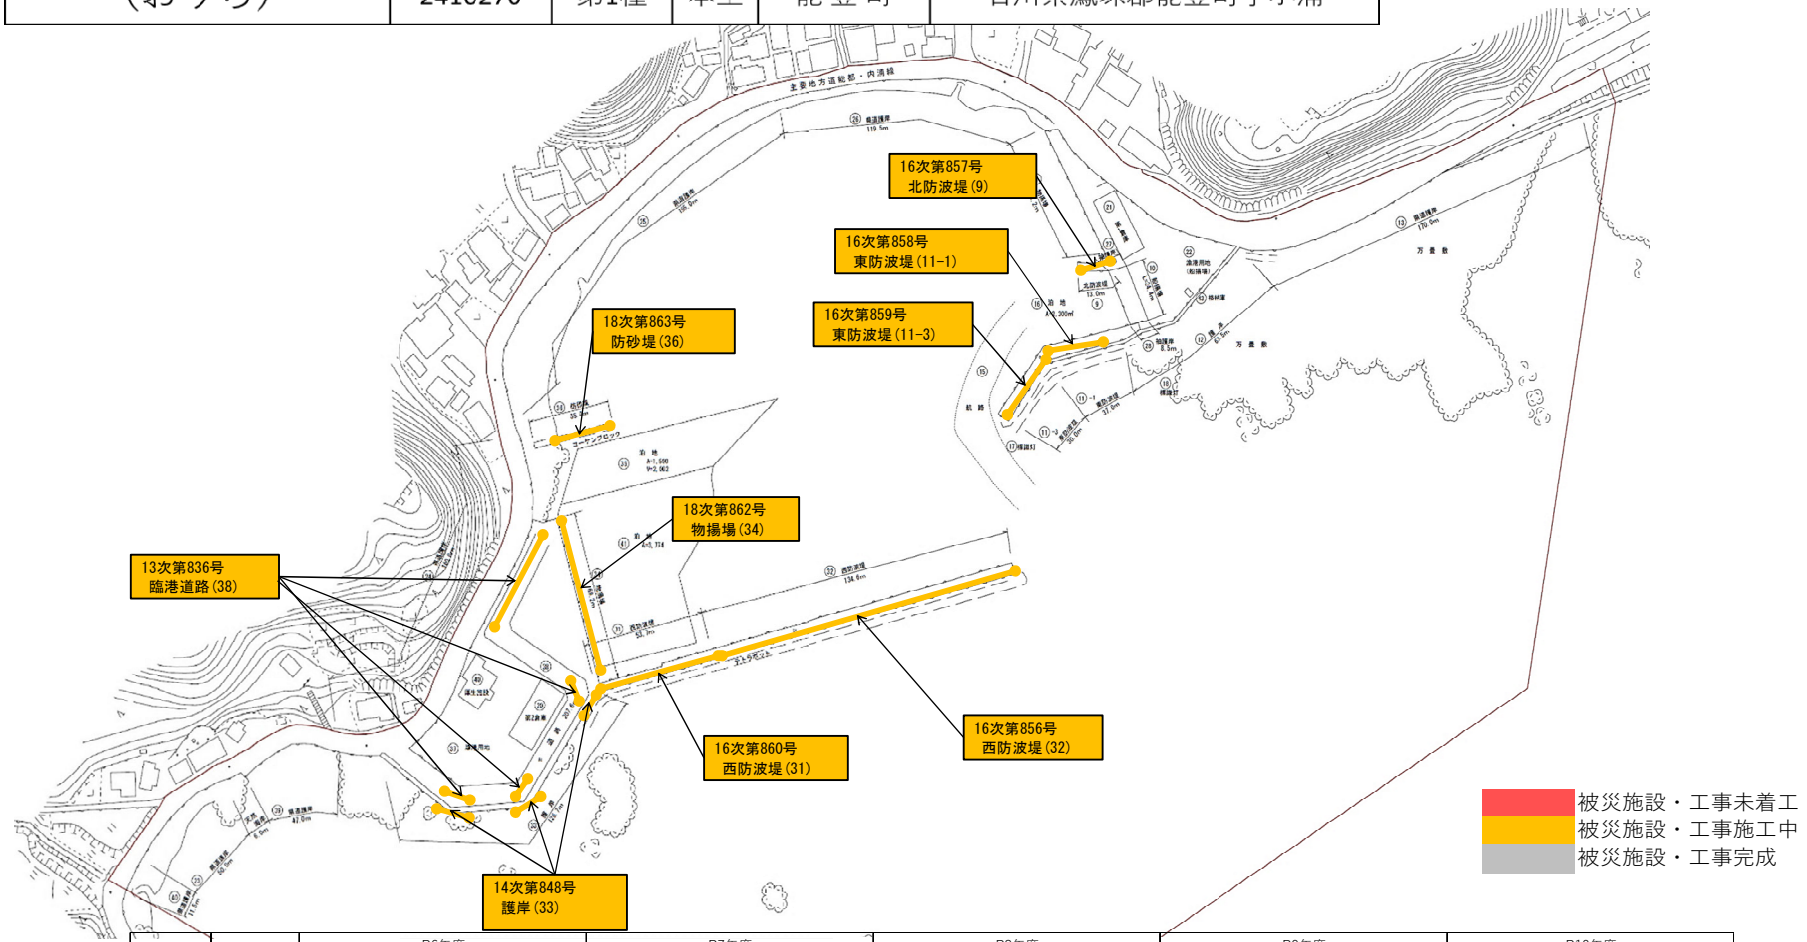


工事番号	大規模 通常	R6年度				R7年度				R8年度				R9年度				R10年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
836	大規模																				
848	大規模																				
856	大規模																				
857	大規模																				
858	大規模																				
859	大規模																				
860	大規模																				
862	大規模																				
863	大規模																				

測量・調査
地質調査
設計
工事
上段：予定
下段：実績
変更協議
被災施設・工事未着工
被災施設・工事施工中
被災施設・工事完成
測量・調査実績
地質調査実績
設計実績
工事実績（契約済み）

令和８年９月３０日現在

羽根漁港（はね）	漁港番号	種　別	所管	管理者	施工場所
	2410260	第1種	本土	能登町	石川県鳳珠郡能登町字羽根

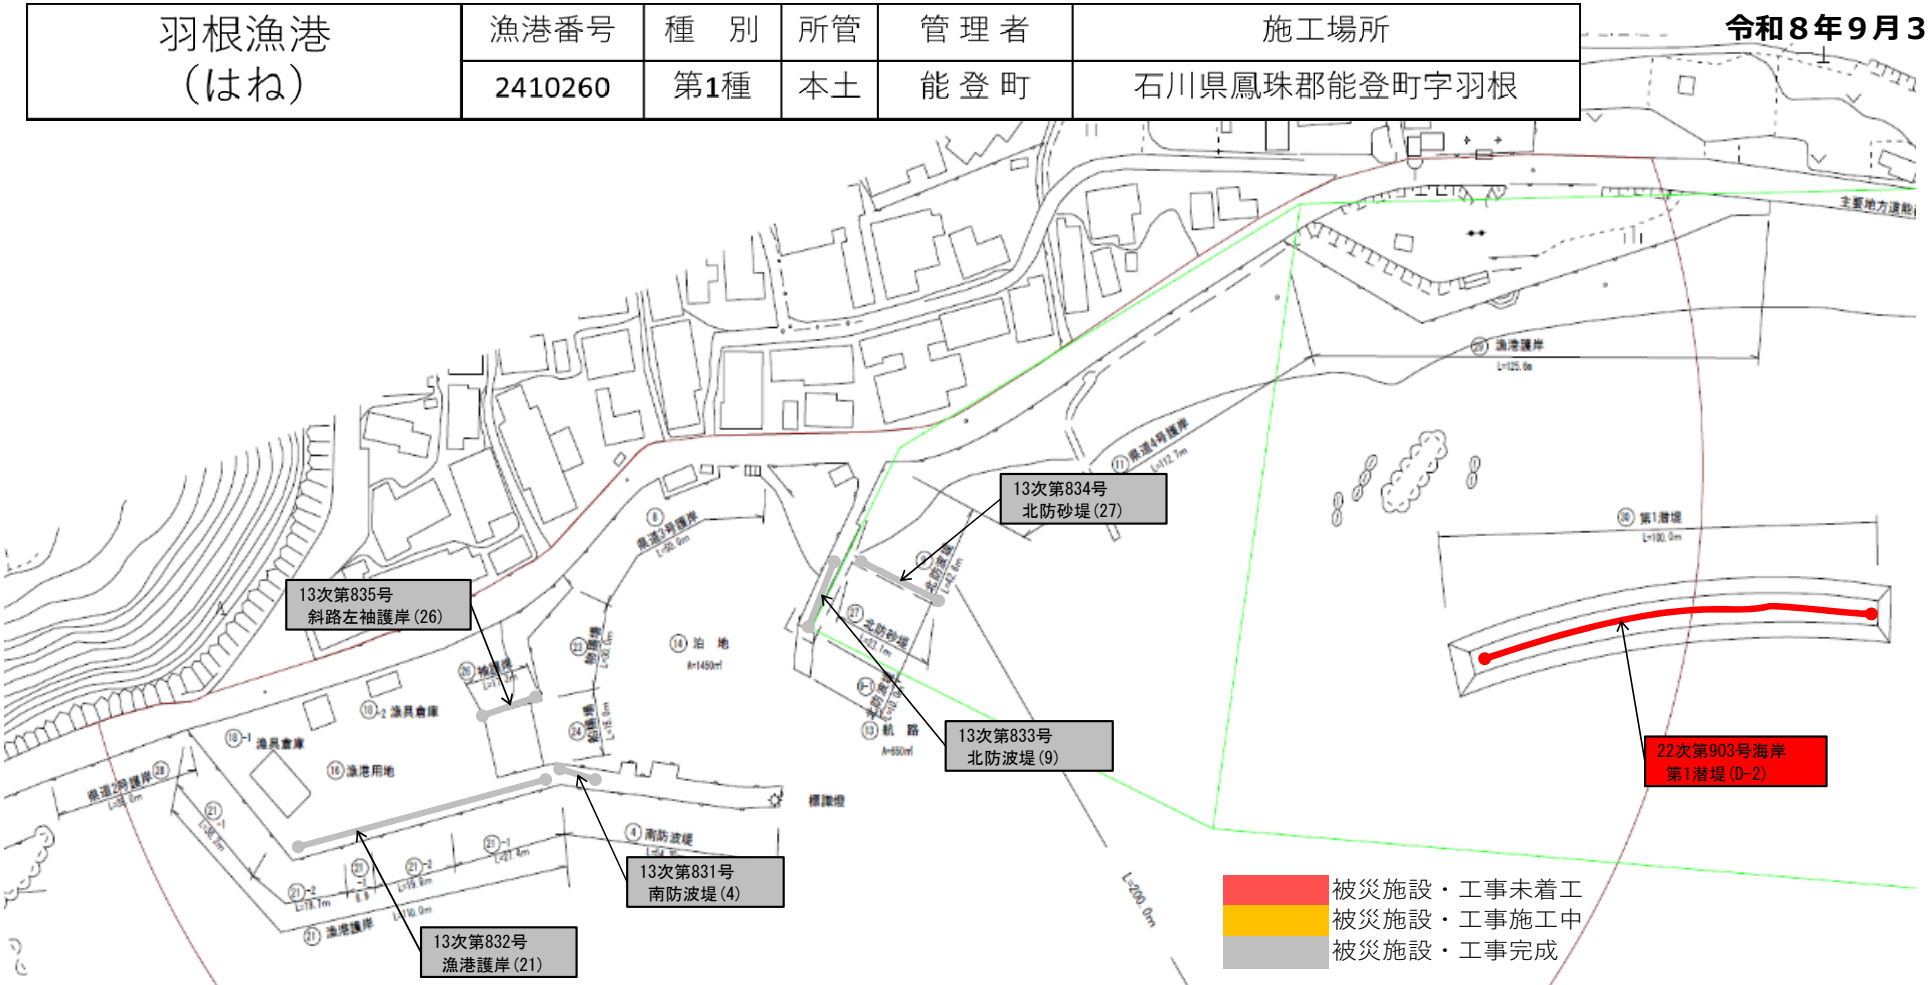

工事番号	大規模 通常	R6年度				R7年度				R8年度				R9年度				R10年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	3.33E+78
831	大規模																				
832	大規模																				
833	大規模																				
834	大規模																				
835	大規模																				
903	大規模																				

測量・調査
地質調査
設計
工事


上段：予定
下段：実績
変更協議

被災施設・工事未着工
被災施設・工事施工中
被災施設・工事完成

測量・調査実績
地質調査実績
設計実績
工事実績（契約済み）

藤波漁港 （ふじなみ）	漁港番号	種　別	所管	管理者	施工場所
	2410250	第1種	本土	能登町	石川県鳳珠郡能登町字藤波

令和８年９月３０日現在

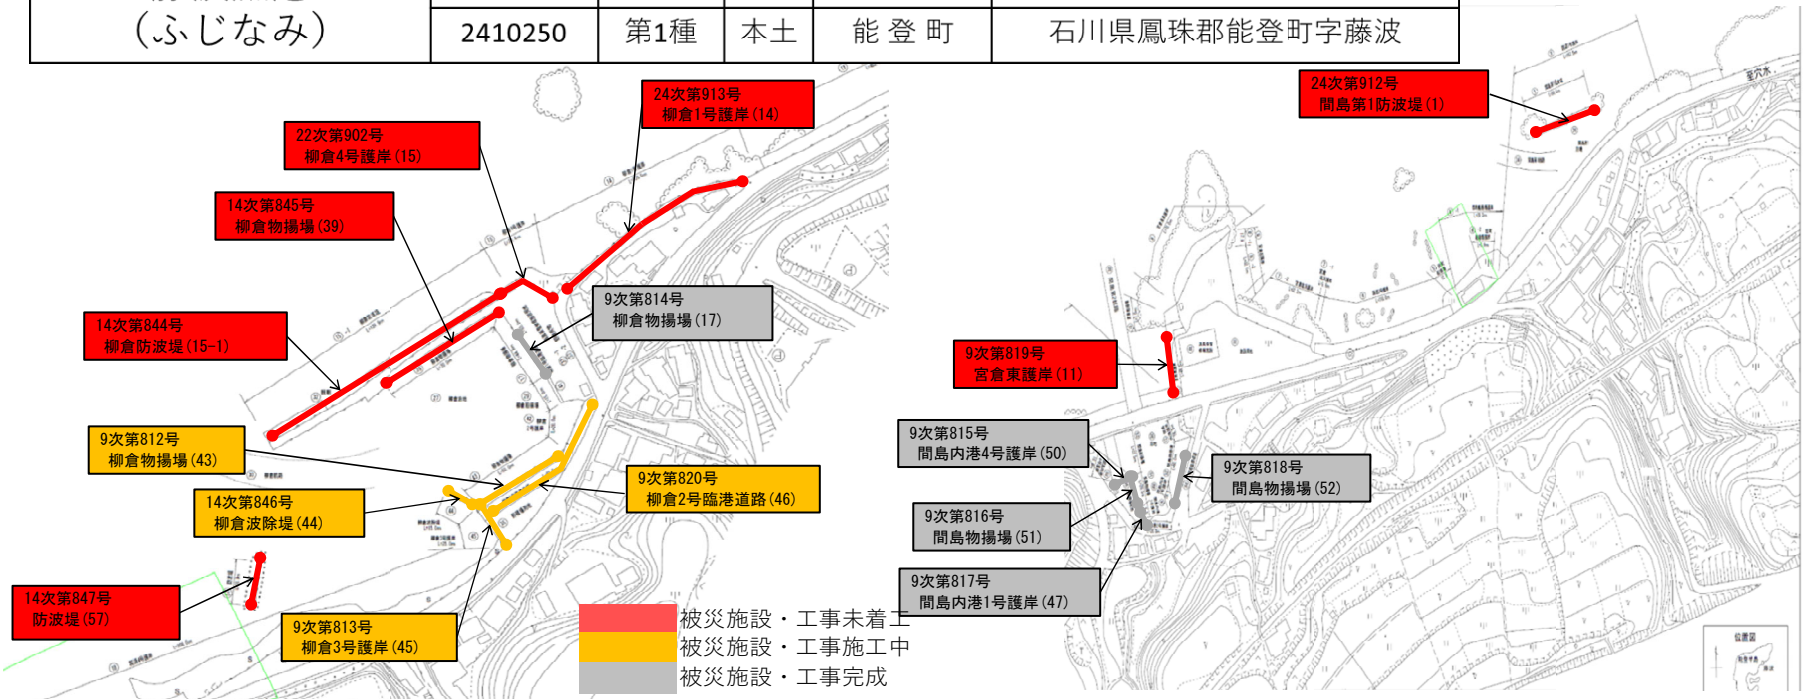

工事番号	大規模 通常	R6年度				R7年度				R8年度				R9年度				R10年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	3.33E+78
812	大規模																				
813	大規模																				
814	通常																				
815	通常																				
816	通常																				
817	大規模																				
818	通常																				
819	大規模																				
820	大規模																				
844	大規模																				
845	大規模																				
846	大規模																				
847	大規模																				
902	大規模																				
912	大規模																				
913	大規模																				

測量・調査
地質調査
設計
工事


上段：予定
下段：実績
変更協議

被災施設・工事未着工
被災施設・工事施工中
被災施設・工事完成

測量・調査実績
地質調査実績
設計実績
工事実績（契約済み）

波並漁港 （はなみ）	漁港番号	種　別	所管	管 理 者	施工場所
	2410240	第1種	本土	能 登 町	石川県鳳珠郡能登町字波並

令和８年９月３０日現在

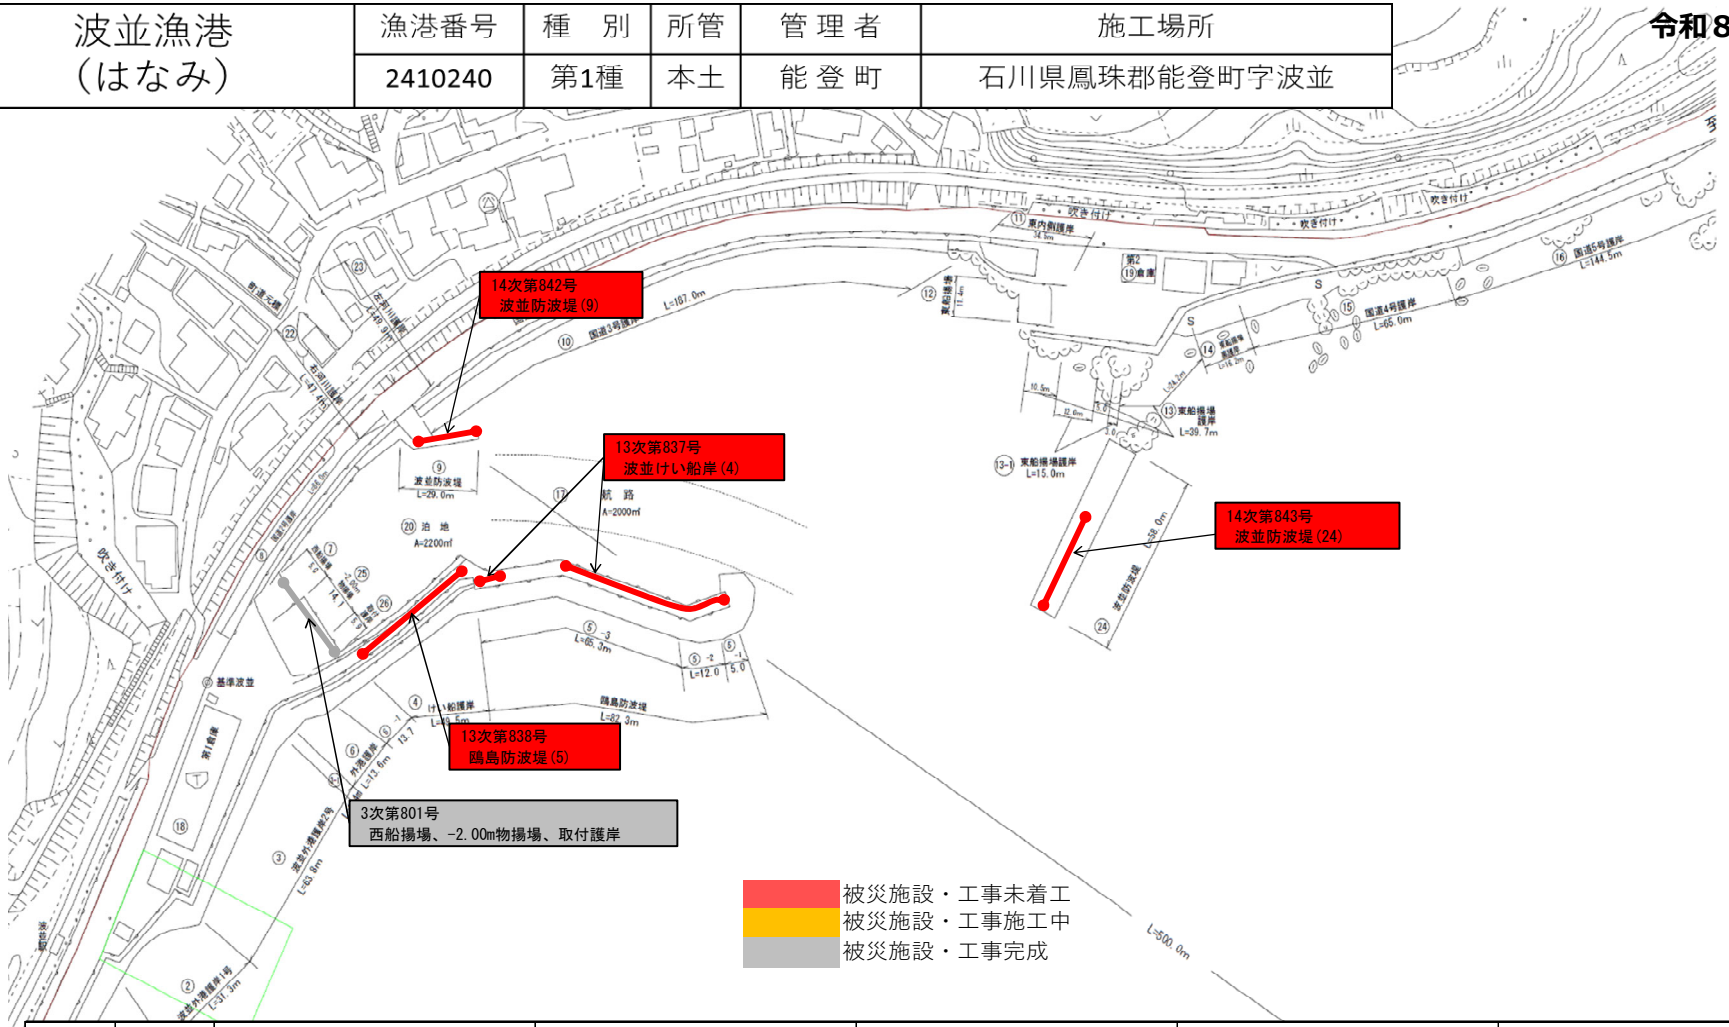

工事番号	大規模 通常	R6年度				R7年度				R8年度				R9年度				R10年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	3.33E+78
801	通常																				
837	大規模																				
838	大規模																				
842	大規模																				
843	大規模																				

測量・調査
地質調査
設計
工事


上段：予定
下段：実績
変更協議

被災施設・工事未着工
被災施設・工事施工中
被災施設・工事完成

測量・調査実績
地質調査実績
設計実績
工事実績（契約済み）

矢波漁港 （やなみ）	漁港番号	種　別	所管	管理者	施工場所
	2410230	第1種	本土	能登町	石川県鳳珠郡能登町字矢波

令和８年９月３０日現在

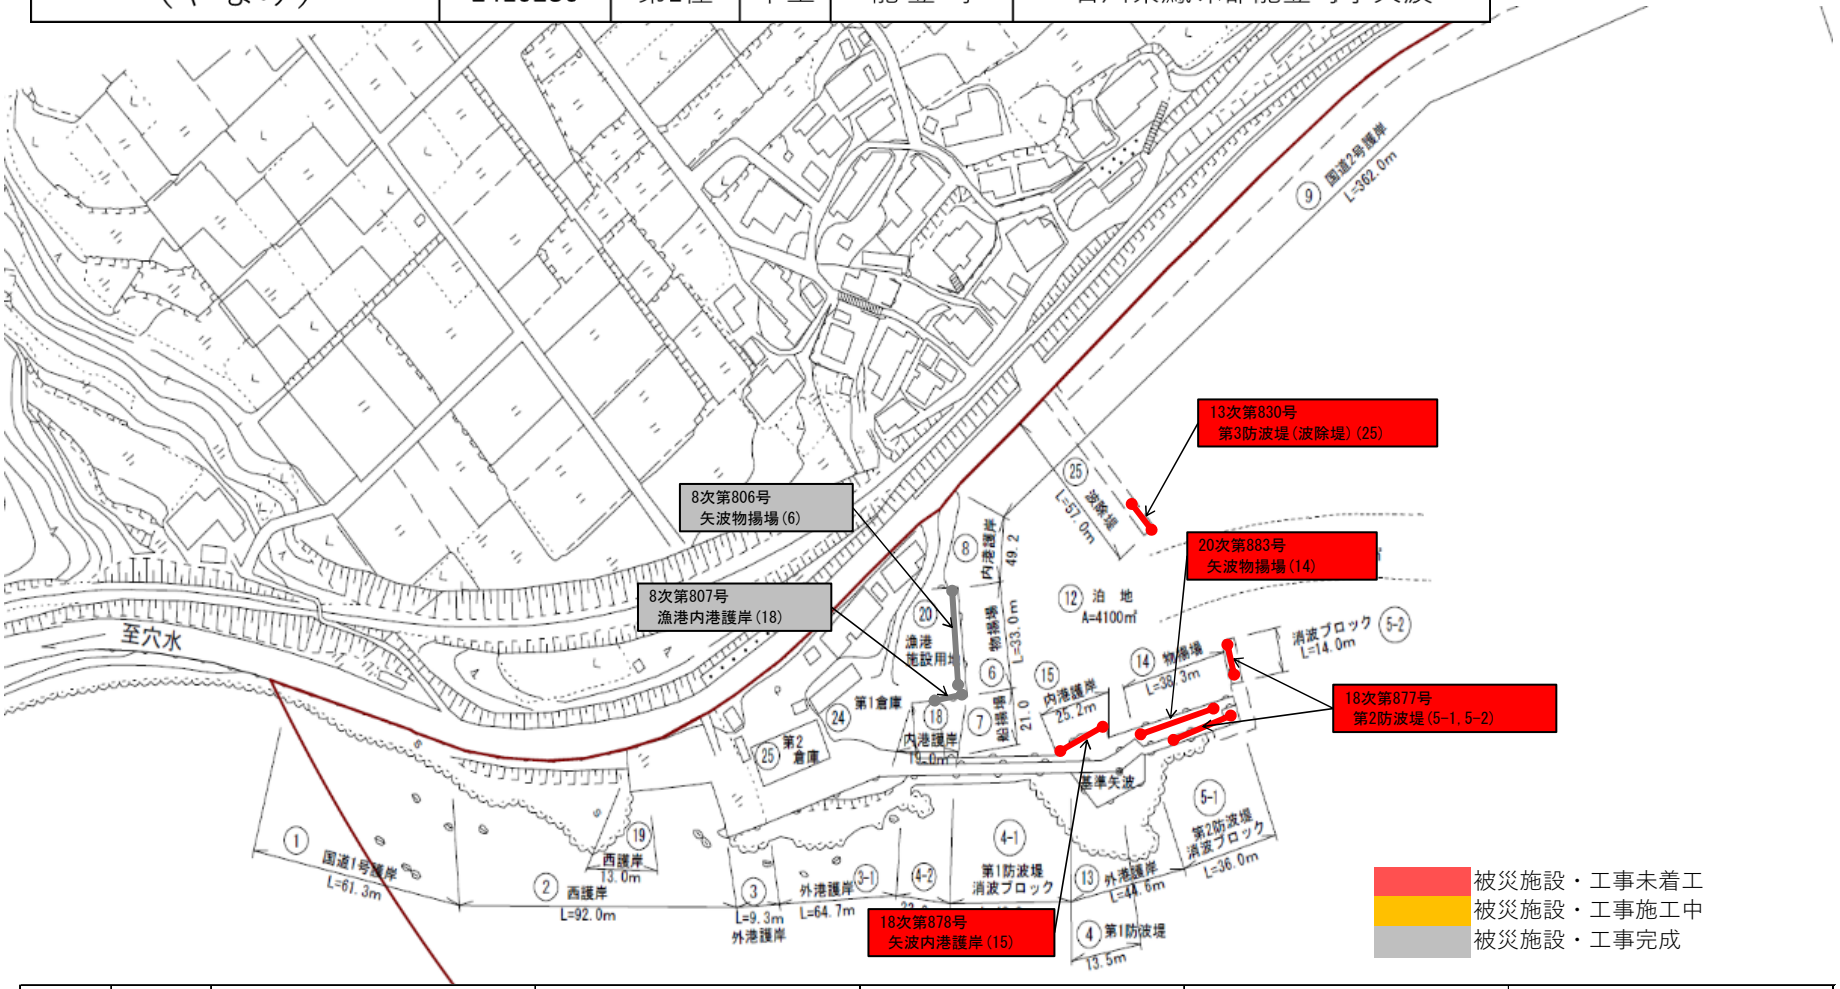


工事番号	大規模 通常	R6年度				R7年度				R8年度				R9年度				R10年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	3.33E+78
806	通常																				
807	通常																				
830	大規模																				
877	大規模																				
878	大規模																				
883	大規模																				

測量・調査
地質調査
設計
工事
上段：予定
下段：実績
変更協議
被災施設・工事未着工
被災施設・工事施工中
被災施設・工事完成
測量・調査実績
地質調査実績
設計実績
工事実績（契約済み）

七見漁港 （しちみ）	漁港番号	種　別	所管	管理者	施工場所
	2410460	第1種	本土	能登町	石川県鳳珠郡能登町字七見

令和８年９月３０日現在

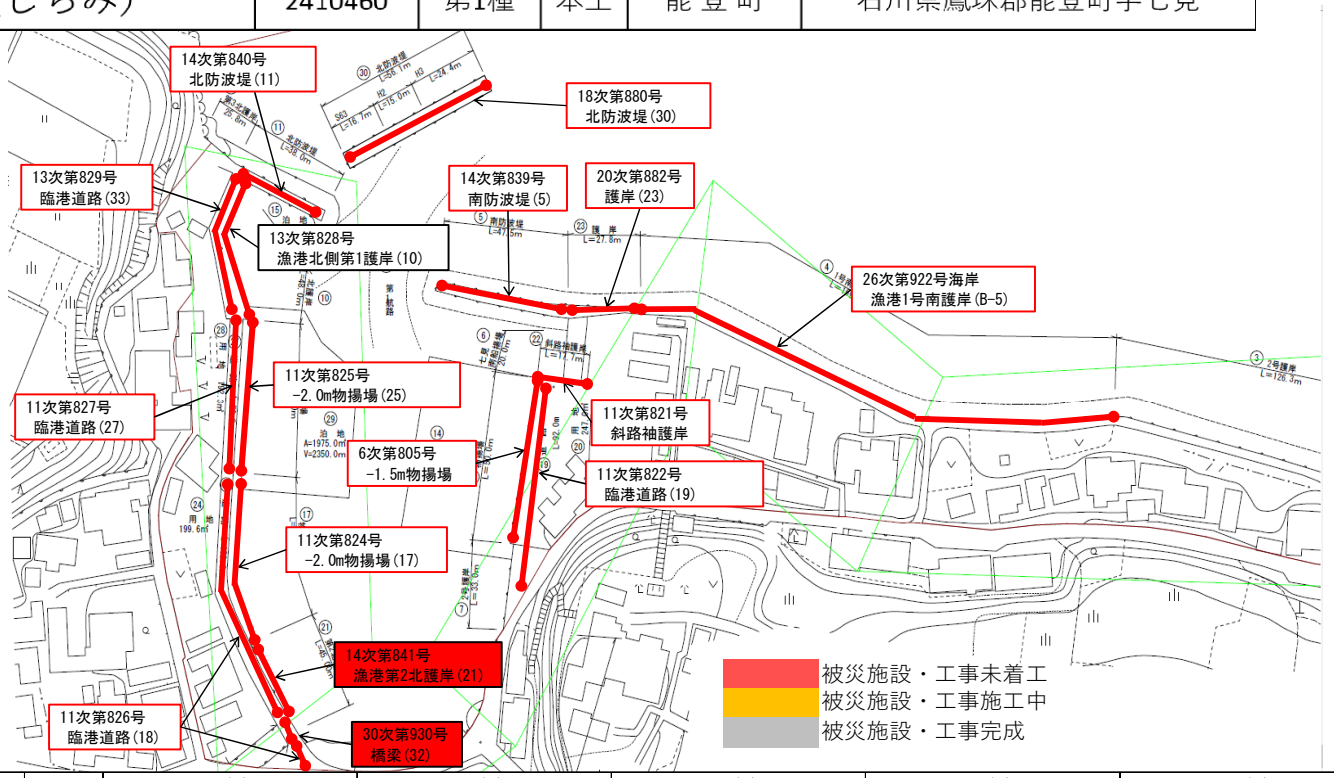



工事番号	大規模 通常	R6年度				R7年度				R8年度				R9年度				R10年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	3.33E+78
805	通常																				
821	大規模																				
822	大規模																				
824	大規模																				
825	大規模																				
826	大規模																				
827	大規模																				
828	大規模																				
829	大規模																				
839	大規模																				
840	大規模																				
841	大規模																				
880	大規模																				
882	大規模																				
922	大規模																				
930	大規模																				

測量・調査
地質調査
設計
工事
上段：予定
下段：実績
変更協議
被災施設・工事未着工
被災施設・工事施工中
被災施設・工事完成
測量・調査実績
地質調査実績
設計実績
工事実績（契約済み）

令和８年９月３０日現在

鵜川漁港（うかわ）	漁港番号	種　別	所管	管理者	施工場所
	2410215	第1種	本土	能登町	石川県鳳珠郡能登町字鵜川

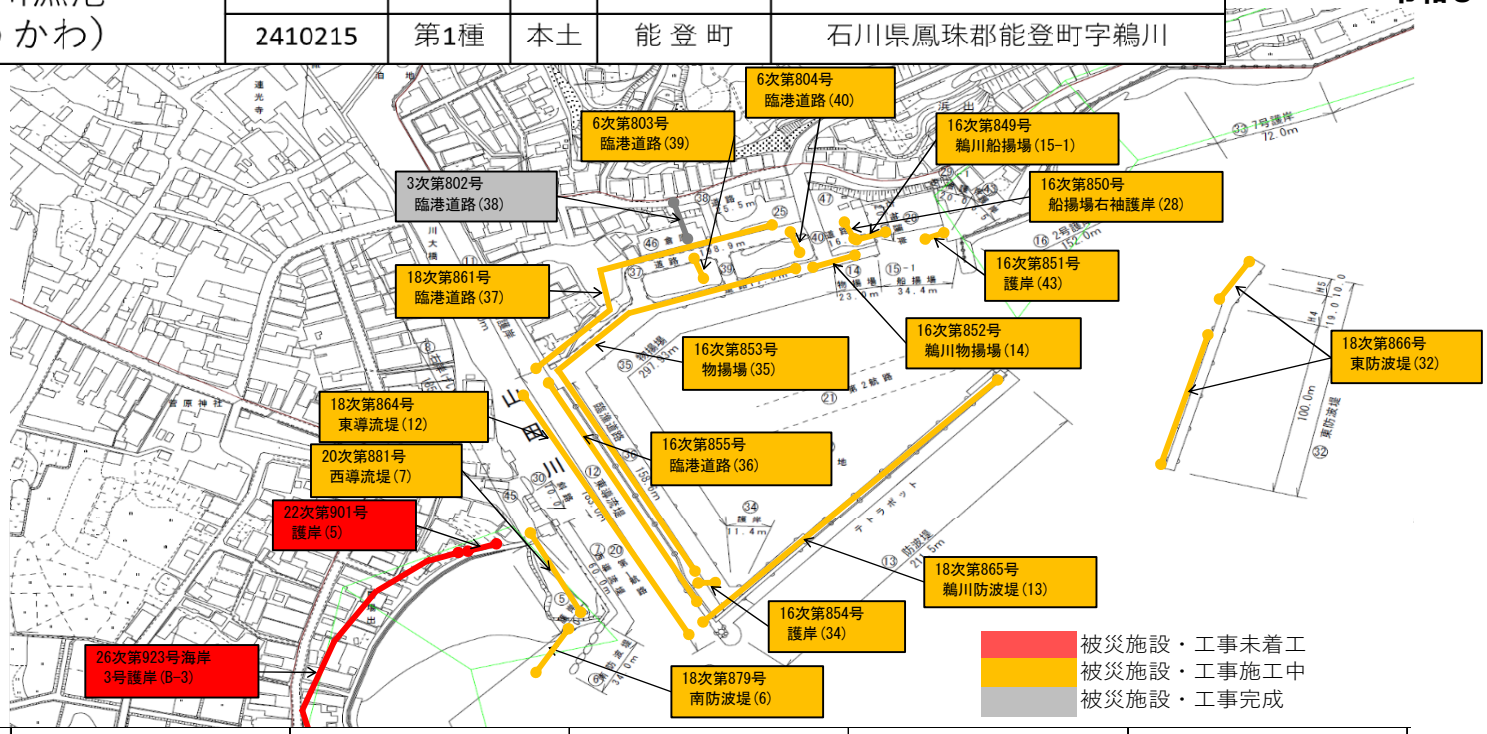

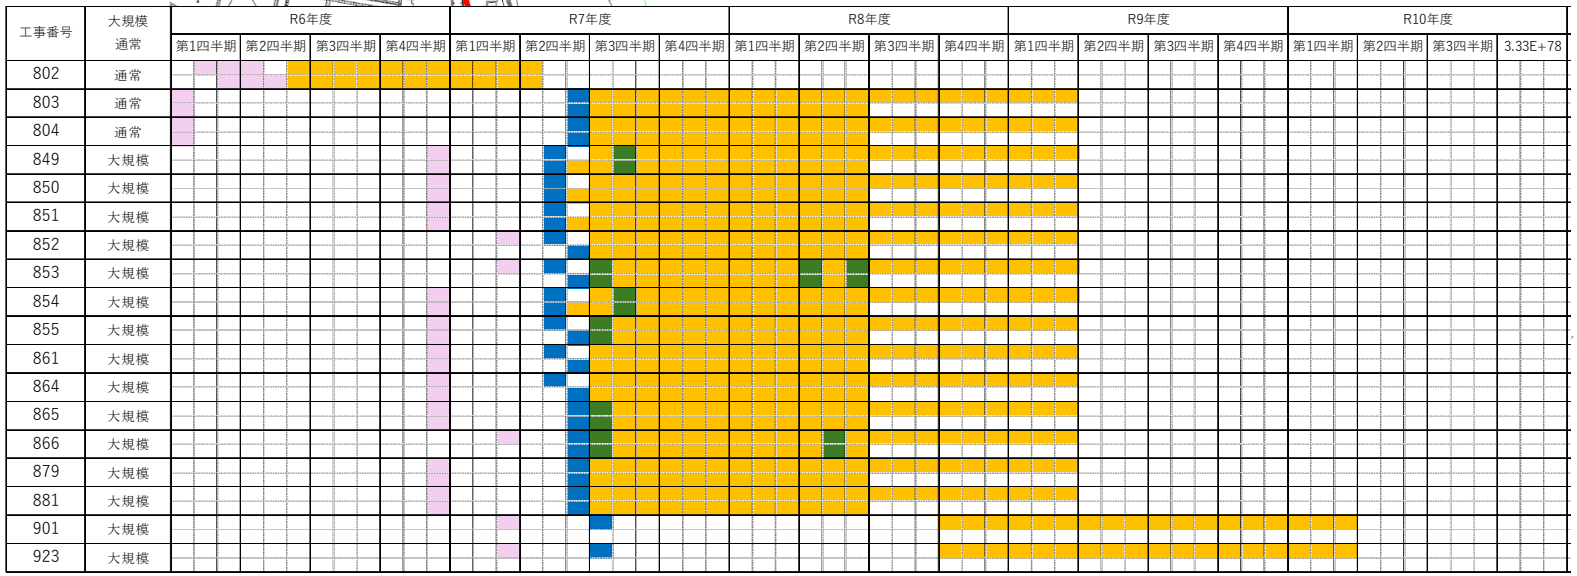

測量・調査
地質調査
設計
工事
上段：予定
下段：実績
変更協議
被災施設・工事未着工
被災施設・工事施工中
被災施設・工事完成
測量・調査実績
地質調査実績
設計実績
工事実績（契約済み）
