【2026.11.30 説明資料】

# 復旧・復興に関する
# 住民懇談会

## 松波小学校区

内浦総合支所ホール／午後６時半から

# 目次


01 開会

02 町長あいさつ

03 出席者紹介

04 説明①

① インフラの復旧・復興見通しについて

② 町復興計画（復旧期）の進捗について

05 意見交換①

06 説明②

③ 地区別復興まちづくり計画主要事業の進捗について

07 意見交換②

08 副町長あいさつ

09 閉会

①-1


# 公共土木施設等の復旧見通しについて

（建設水道課）

# 災害復旧事業(公災)の発注方針

| 区分 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|---|---|---|---|---|
| 上水道<br>下水道 | 道路の優先度及び上下水の被災度を考慮した区域 | | その他地区の被災箇所 | 概ね完了 |
| 道路(町)<br>橋梁(町)<br>きょうりょう | ・主要幹線道路(緊急輸送道路、幹線1・2級町道)<br>・不通道路<br>・孤立集落、重要路線、地域拠点へのアクセス道路 等 | | 左記以外の道路<br>・集落内道路<br>・生活道路等 | 概ね完了 |
| 河川(町) | ・人家連担(近接)部で特に被害が甚大な区間<br>・農地、農業用施設部 | | 左記河川以外の区間 | 概ね完了 |

# インフラ施設 復旧計画図（松波地区）

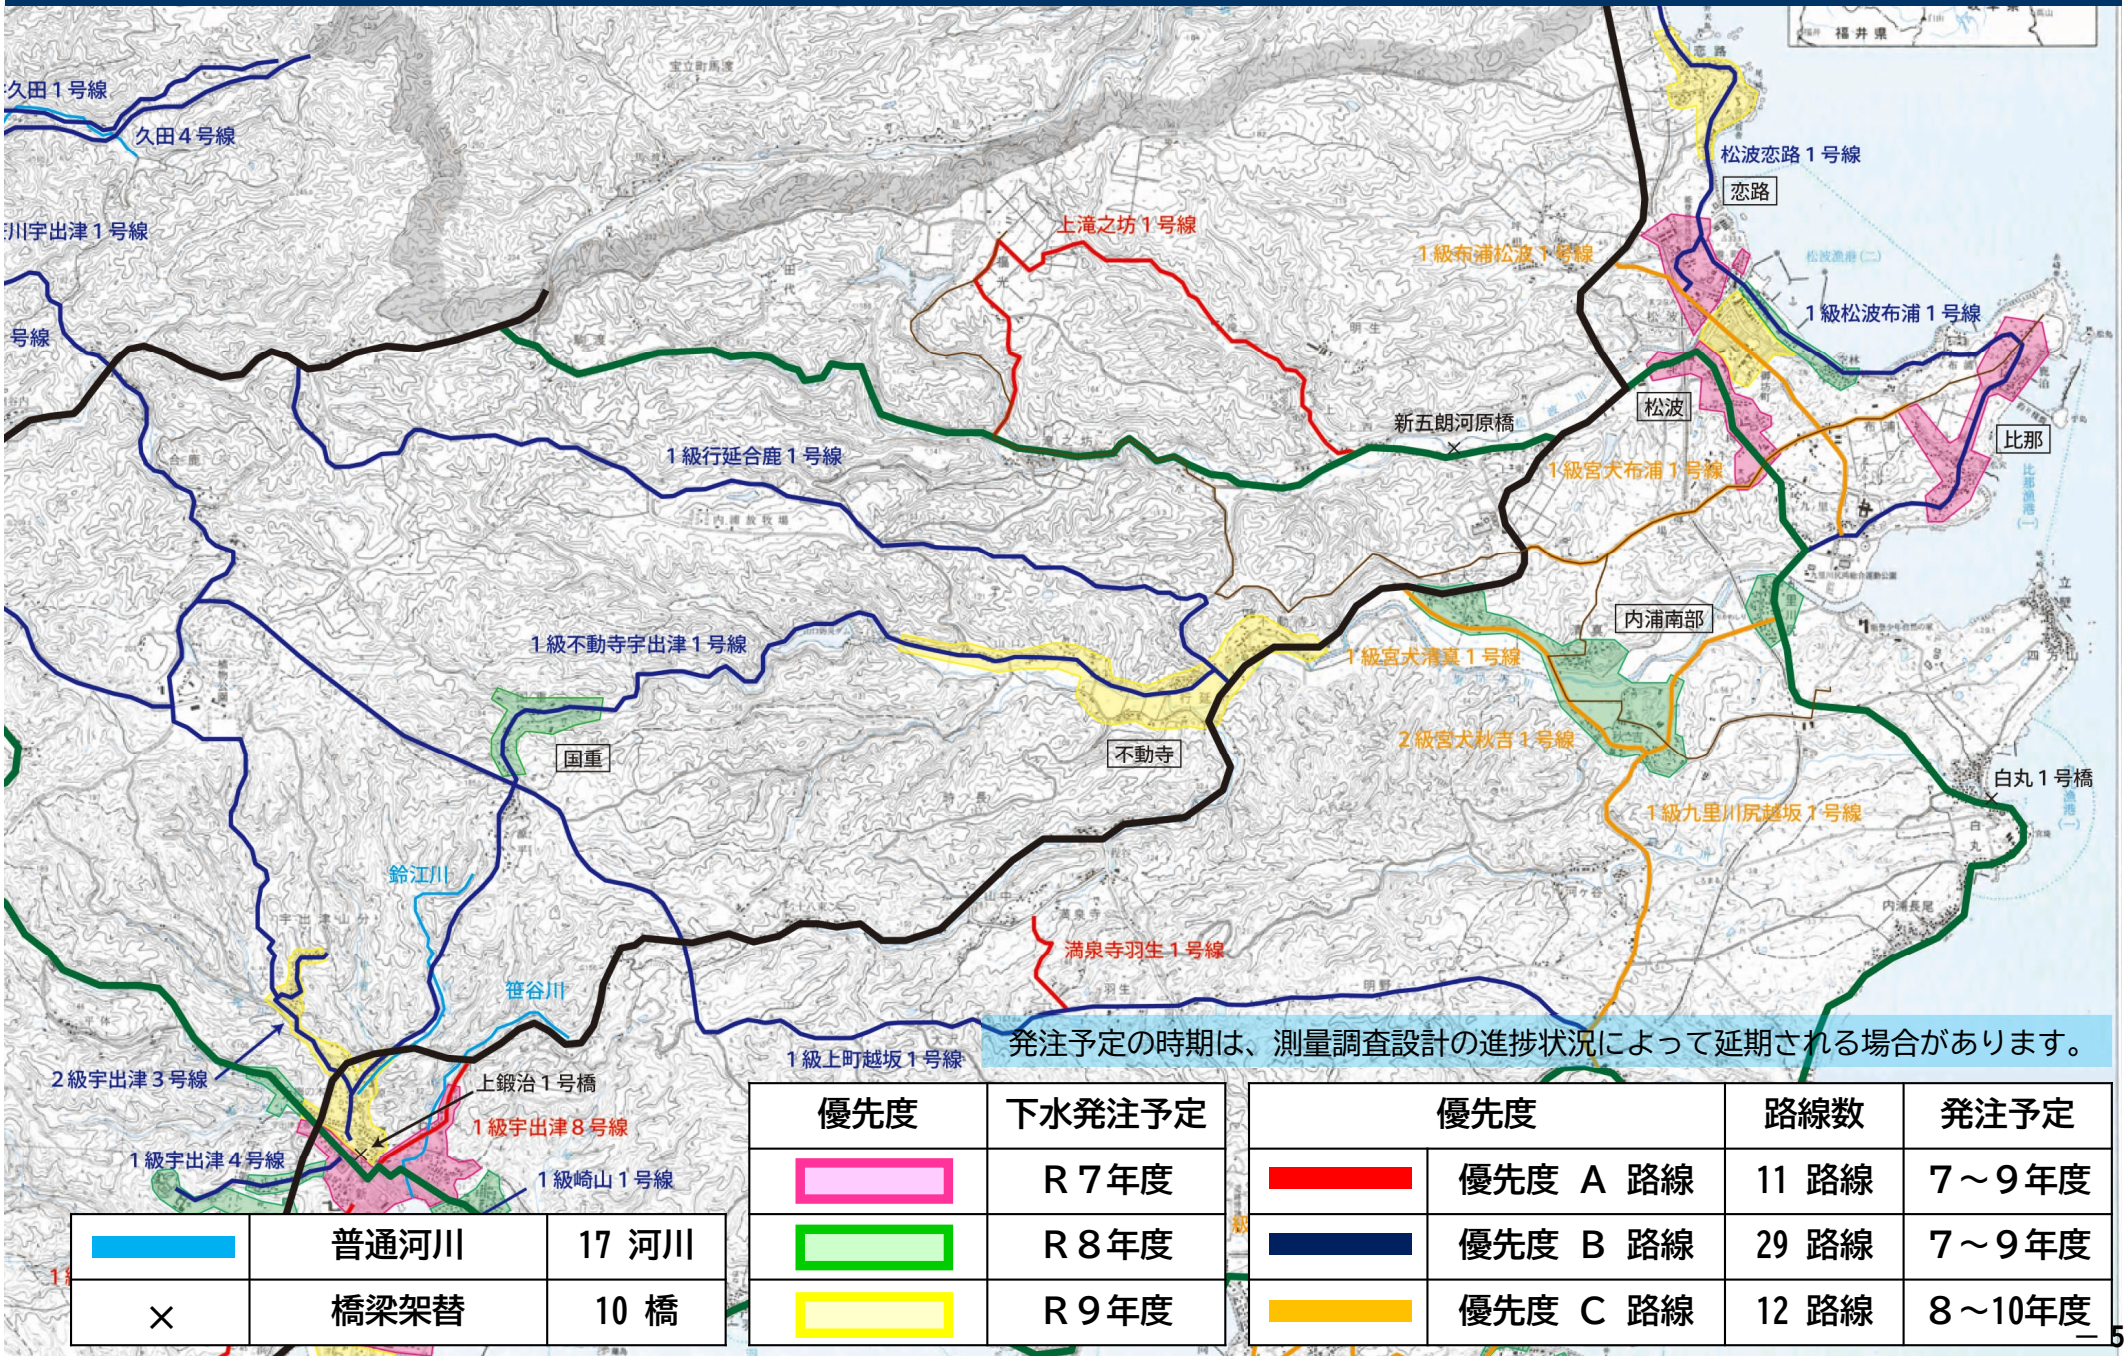


発注予定の時期は、測量調査設計の進捗状況によって延期される場合があります。

| | | |
|---|---|---|
| | 普通河川 | 17 河川 |
| × | 橋梁架替 | 10 橋 |

| 優先度 | 下水発注予定 |
|---|---|
| | R７年度 |
| | R８年度 |
| | R９年度 |

| 優先度 | | 路線数 | 発注予定 |
|---|---|---|---|
| | 優先度 A 路線 | 11 路線 | ７～９年度 |
| | 優先度 B 路線 | 29 路線 | ７～９年度 |
| | 優先度 C 路線 | 12 路線 | ８～10年度 |

# 主要町道復旧計画

主要町道復旧計画　　（注）発注予定の時期は、測量調査設計の進捗状況によって延期される場合があります。予定は随時更新します。　　R08.11.01 時点

| | 番号 | 路線名 | 優先度 | 種別 | 令和８年度 | | | | | | | | | | | | 令和９年度 | | | | | | | | | | | | 令和10年度 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | |
| 1 | 6-5506 | 1級藤波宇出津2号線 | A | 路面 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 | 6-5508 | 1級宇出津8号線 | A | 施設 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 3 | 6-5527 | 2級寺分曽又1号線 | A | 施設 | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 4 | 6-5539 | 藤波矢波1号線 | A | 施設 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6-5572 | 2級藤ノ瀬1号線 | A | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 6 | 6-5624 | 上滝之坊1号線 | A | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 7 | 6-5627 | 小木2号線 | A | 施設 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 8 | 6-5628 | 小木市之瀬1号線 | A | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 9 | 6-5629 | 満泉寺羽生1号線 | A | 施設 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6-5665 | 柳田21号線 | A | 施設 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 11 | 6-5740 | 柳田20号線 | A | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 12 | 6-5839 | 当目大箱1号線 | A | 超簡素 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 13 | 6-5501 | 2級瑞穂武連1号線 | B | 路面 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 14 | 6-5503 | 2級瑞穂鶴町1号線 | B | 路面 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 15 | 6-5509 | 1級崎山1号線 | B | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 16 | 6-5510 | 1級崎山1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 17 | 6-5511 | 1級七見鵜川1号線 | B | 路面 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 18 | 6-5512 | 1級七見鵜川1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 19 | 6-5513 | 1級崎山1号線 | B | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 20 | 6-5516 | 1級上町越坂1号線 | B | 路面 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 21 | 6-5517 | 1級上町越坂1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 22 | 6-5518 | 1級不動寺宇出津1号線 | B | 路面 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 23 | 6-5519 | 1級不動寺宇出津1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 24 | 6-5520 | 1級松波布浦1号線 | B | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 25 | 6-5521 | 1級松波布浦1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 26 | 6-5522 | 十郎原黒川1号線 | B | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 27 | 6-5523 | 1級笹川宇出津1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 28 | 6-5525 | 1級天坂藤ノ瀬1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 29 | 6-5528 | 1級石井鈴ヶ嶺1号線 | B | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 30 | 6-5529 | 1級石井鈴ヶ嶺1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |

# 主要町道復旧計画

主要町道復旧計画　（注）発注予定の時期は、測量調査設計の進捗状況によって延期される場合があります。予定は随時更新します。　R08.11.01 時点

| | 番号 | 路線名 | 優先度 | 種別 | 令和８年度 | | | | | | | | | | | | 令和９年度 | | | | | | | | | | | | 令和10年度 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ６月 | ９月 | 12月 | ３月 | |
| 31 | 6-5530 | 1級神和住柳田1号線 | B | 路面 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 32 | 6-5531 | 1級神和住柳田1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 33 | 6-5540 | 2級宇加塚鶴町1号線 | B | 路面 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 34 | 6-5547 | 1級行延合鹿1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 35 | 6-5549 | 1級鴨川上長尾1号線 | B | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 36 | 6-5550 | 1級鴨川上長尾1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 37 | 6-5551 | 2級柳田1号線 | B | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 38 | 6-5553 | 1級当目鶴町1号線 | B | 路面 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 39 | 6-5554 | 1級当目鶴町1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 40 | 6-5555 | 2級柳田1号線 | B | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 41 | 6-5557 | 2級瑞穂鶴町1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 42 | 6-5558 | 1級柳田国光1号線 | B | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 43 | 6-5558 | 1級笹川宇出津1号線 | B | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 44 | 6-5558 | 2級笹川十郎原1号線 | B | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 45 | 6-5558 | 1級行延合鹿1号線 | B | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 46 | 6-5562 | 2級宇出津3号線 | B | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 47 | 6-5563 | 2級宇出津3号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 48 | 6-5590 | 柿生10号線 | B | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 49 | 6-5595 | 鈴ヶ嶺2号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 50 | 6-5595 | 鈴ヶ嶺8号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 51 | 6-5615 | 2級瑞穂武連1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 52 | 6-5616 | 2級当目1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 53 | 6-5619 | 1級宇出津4号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 54 | 6-5625 | 松波恋路1号線 | B | 路面 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 55 | 6-5626 | 松波恋路1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 56 | 6-5630 | 2級笹川十郎原1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 57 | 6-5632 | 十郎原黒川1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 58 | 6-5644 | 柿生10号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 59 | 6-5645 | 1級鴨川上長尾1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 60 | 6-5677 | 1級鴨川上長尾1号線 | B | 路面 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |

# 主要町道復旧計画

主要町道復旧計画　　（注）発注予定の時期は、測量調査設計の進捗状況によって延期される場合があります。予定は随時更新します。　　R08.11.01 時点


| | 番号 | 路線名 | 優先度 | 種別 | 令和８年度 | | | | | | | | | | | | 令和９年度 | | | | | | | | | | | | 令和10年度 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ６月 | ９月 | 12月 | ３月 | |
| 61 | 6-5750 | 2級石井久田1号線 | B | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 6-5750 | 久田上町1号線 | B | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 6-5750 | 久田4号線 | B | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 6-5839 | 2級当目1号線 | B | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 6-5848 | 1級当目鶴町1号線 | B | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 6-5942 | 1級上町越坂1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 6-9398 | 1級不動寺宇出津1号線 | B | 施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 6-5505 | 1級藤波宇出津1号線 | C | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 6-5514 | 1級九里川尻越坂1号線 | C | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 6-5515 | 1級真脇小木1号線 | C | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 6-5541 | 1級布浦松波1号線 | C | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 6-5545 | 1級宮犬清真1号線 | C | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 6-5558 | 2級柳田3号線 | C | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 6-5582 | 1級上町1号線 | C | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 6-5586 | 1級天坂1号線 | C | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 6-5662 | 2級宮犬秋吉1号線 | C | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 6-5692 | 1級真脇小木1号線 | C | 施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 6-5839 | 2級大箱北河内1号線 | C | 超簡素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 6-5867 | 2級柳田3号線 | C | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | 市街地生活道路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 下水復旧と連携 |

# 石川県奥能登土木総合事務所　災害復旧方針

**石川県創造的復興プラン**
**（令和６年６月策定）**

アクセスルートや
水位周知河川など、
**優先度の高い箇所は、**
**令和１０年度までの**
**本復旧完了を目指す**

出典：令和６年能登半島地震 及び奥能登豪雨による 公共土木施設等の 被害と復旧のあゆみ
（県土木部監理課ホームページ）
※完了予定は情勢の変化により変動する可能性があります。

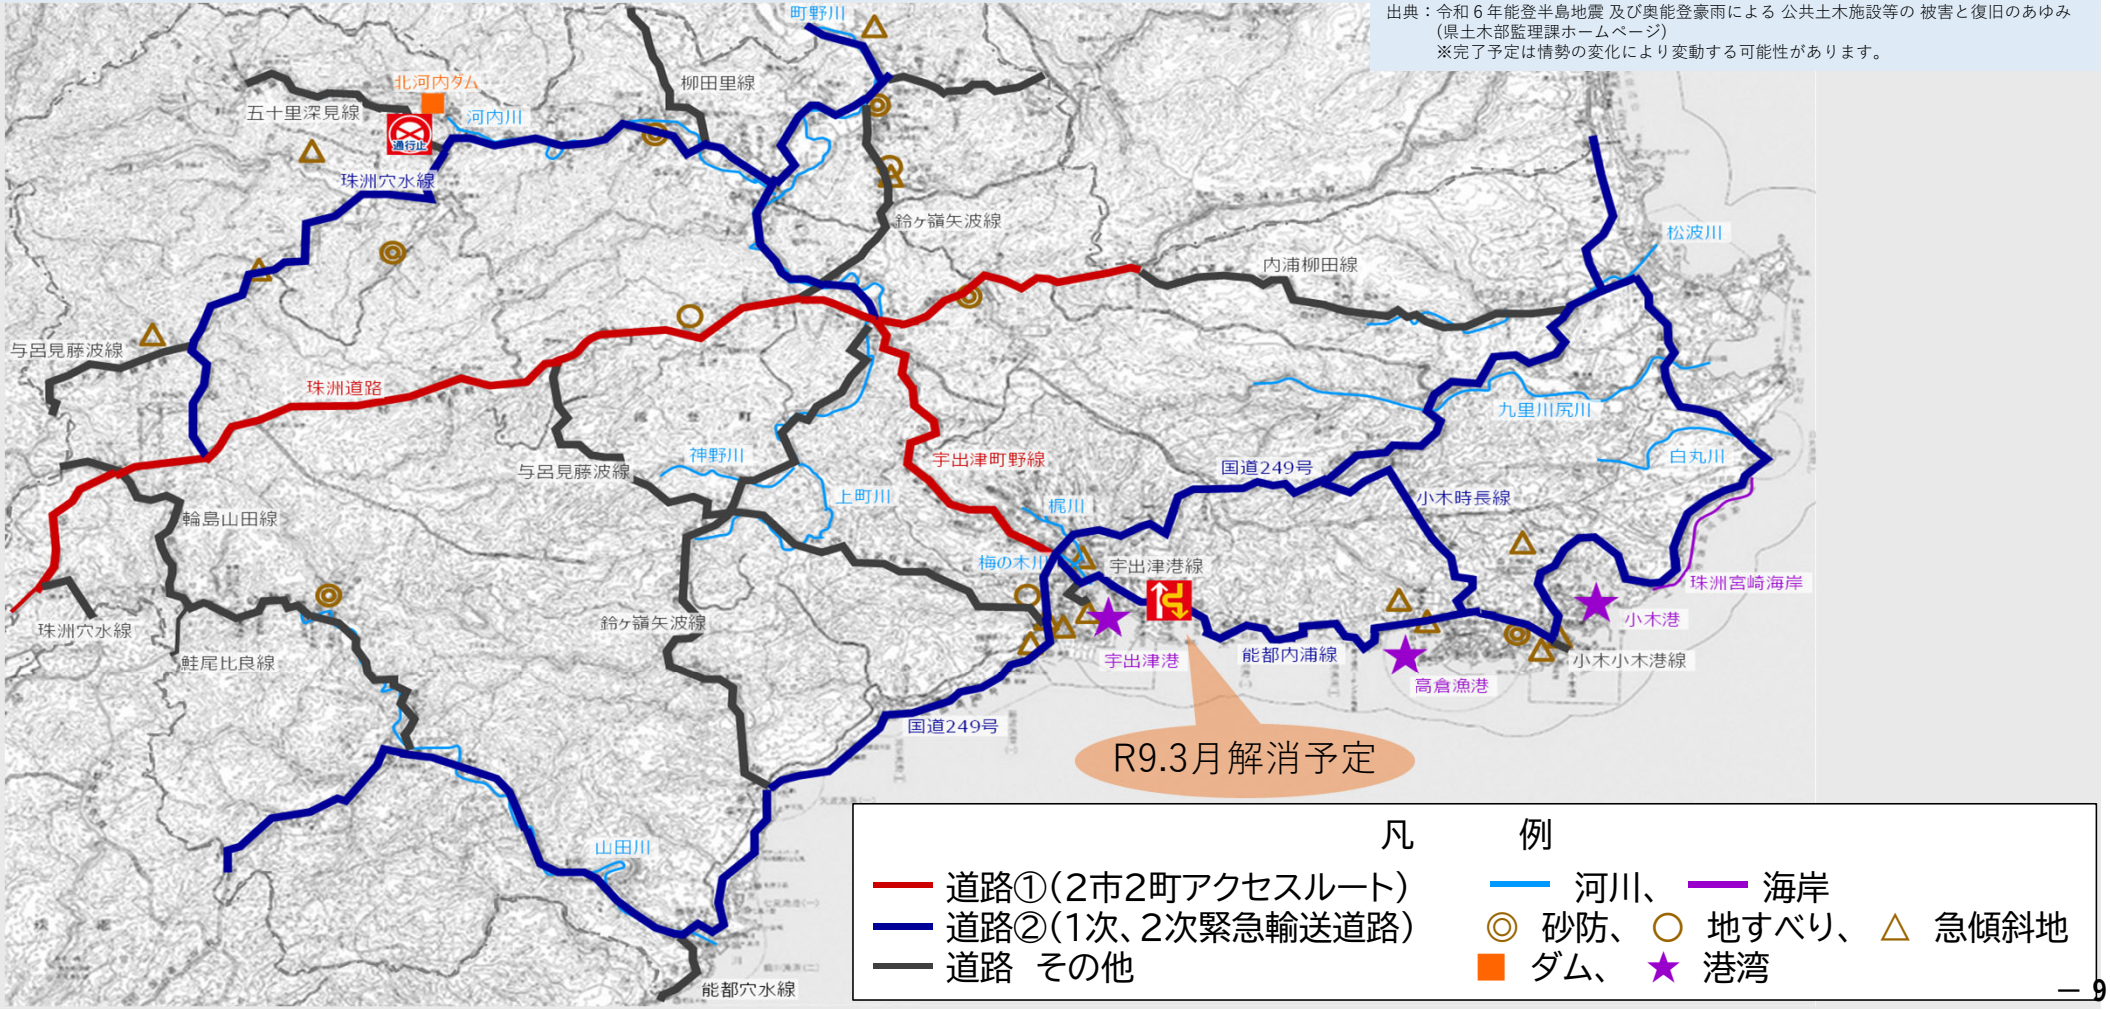

# 石川県奥能登土木総合事務所　災害復旧のあゆみ（ホームページ）

## 能登 復旧・復興 進捗ポータルサイト

令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨　公共土木施設等復旧情報



# 石川県奥能登土木総合事務所　災害復旧工事　進捗状況

2026年9月30日　現在

## 道　　路

### 道路施設

○工事中



輪島浦上線　輪島市鵜入町

○復旧完了



被災時

復旧後



大谷狼煙飯田線　珠洲市三崎町寺家

着手率

**39 %**

着手 315 / 査定 809 箇所

※奥能登土木全体の着手率です。




凡　例(施設区分)

2市2町へのアクセスルート

凡　例　(進捗状況)

- 工事実施中
- R８発注予定
- R９以降発注予定
- 完成

# 石川県奥能登土木総合事務所　災害復旧工事　進捗状況

2026年9月30日　現在

## 河川・海岸・港湾

### 河川施設

○工事中



真名井川　穴水町川島～大町

○復旧完了



被災時



復旧後

町野川　能登町柳田

着手率　**58** %

着手 160 / 査定 274 箇所

### 港湾施設

○工事中



飯田港　珠洲市飯田町

○復旧完了



被災時



復旧後

輪島港　輪島市鳳至町

着手率　**36** %

着手 58 / 査定 163 箇所

※奥能登土木全体の着手率です。




凡　例(施設区分)

★ 港湾

水位周知河川

凡　例　(進捗状況)

工事実施中

R 8 発注予定

R 9 以降発注予定

完成

# 石川県奥能登土木総合事務所　災害復旧工事　進捗状況

2026年9月30日　現在

## 砂　　防

### 砂防施設

○工事中



久田　能登町久田

○復旧完了



被災時

復旧後



天保島　能登町宇出津

着手率

**27 %**

着手 32 / 査定 118 箇所

※奥能登土木全体の着手率です。




凡　例(施設区分)

○　地すべり

△　急傾斜地

◎　砂防

凡　例　(進捗状況)

工事実施中

Ｒ８発注予定

Ｒ９以降発注予定

完成

①-2


# 農林水産業施設の復旧見通しについて

（農林水産課）

# 災害復旧事業（公災）の発注方針

| 区分 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農林治山 | ・各地区の営農ニーズを踏まえ優先的に整備する施設<br>・避難路や幹線道路へのアクセス路となる農道・林道<br>・林地崩壊箇所 | その他地区の被災箇所 | | | 概ね完了 |
| 漁業施設 | ・漁業活動に不可欠な施設<br>・背後集落に被害が及ぶ施設 | その他地区の被災箇所 | | | 概ね完了 |

# 農業関係　災害復旧工事発注見込図

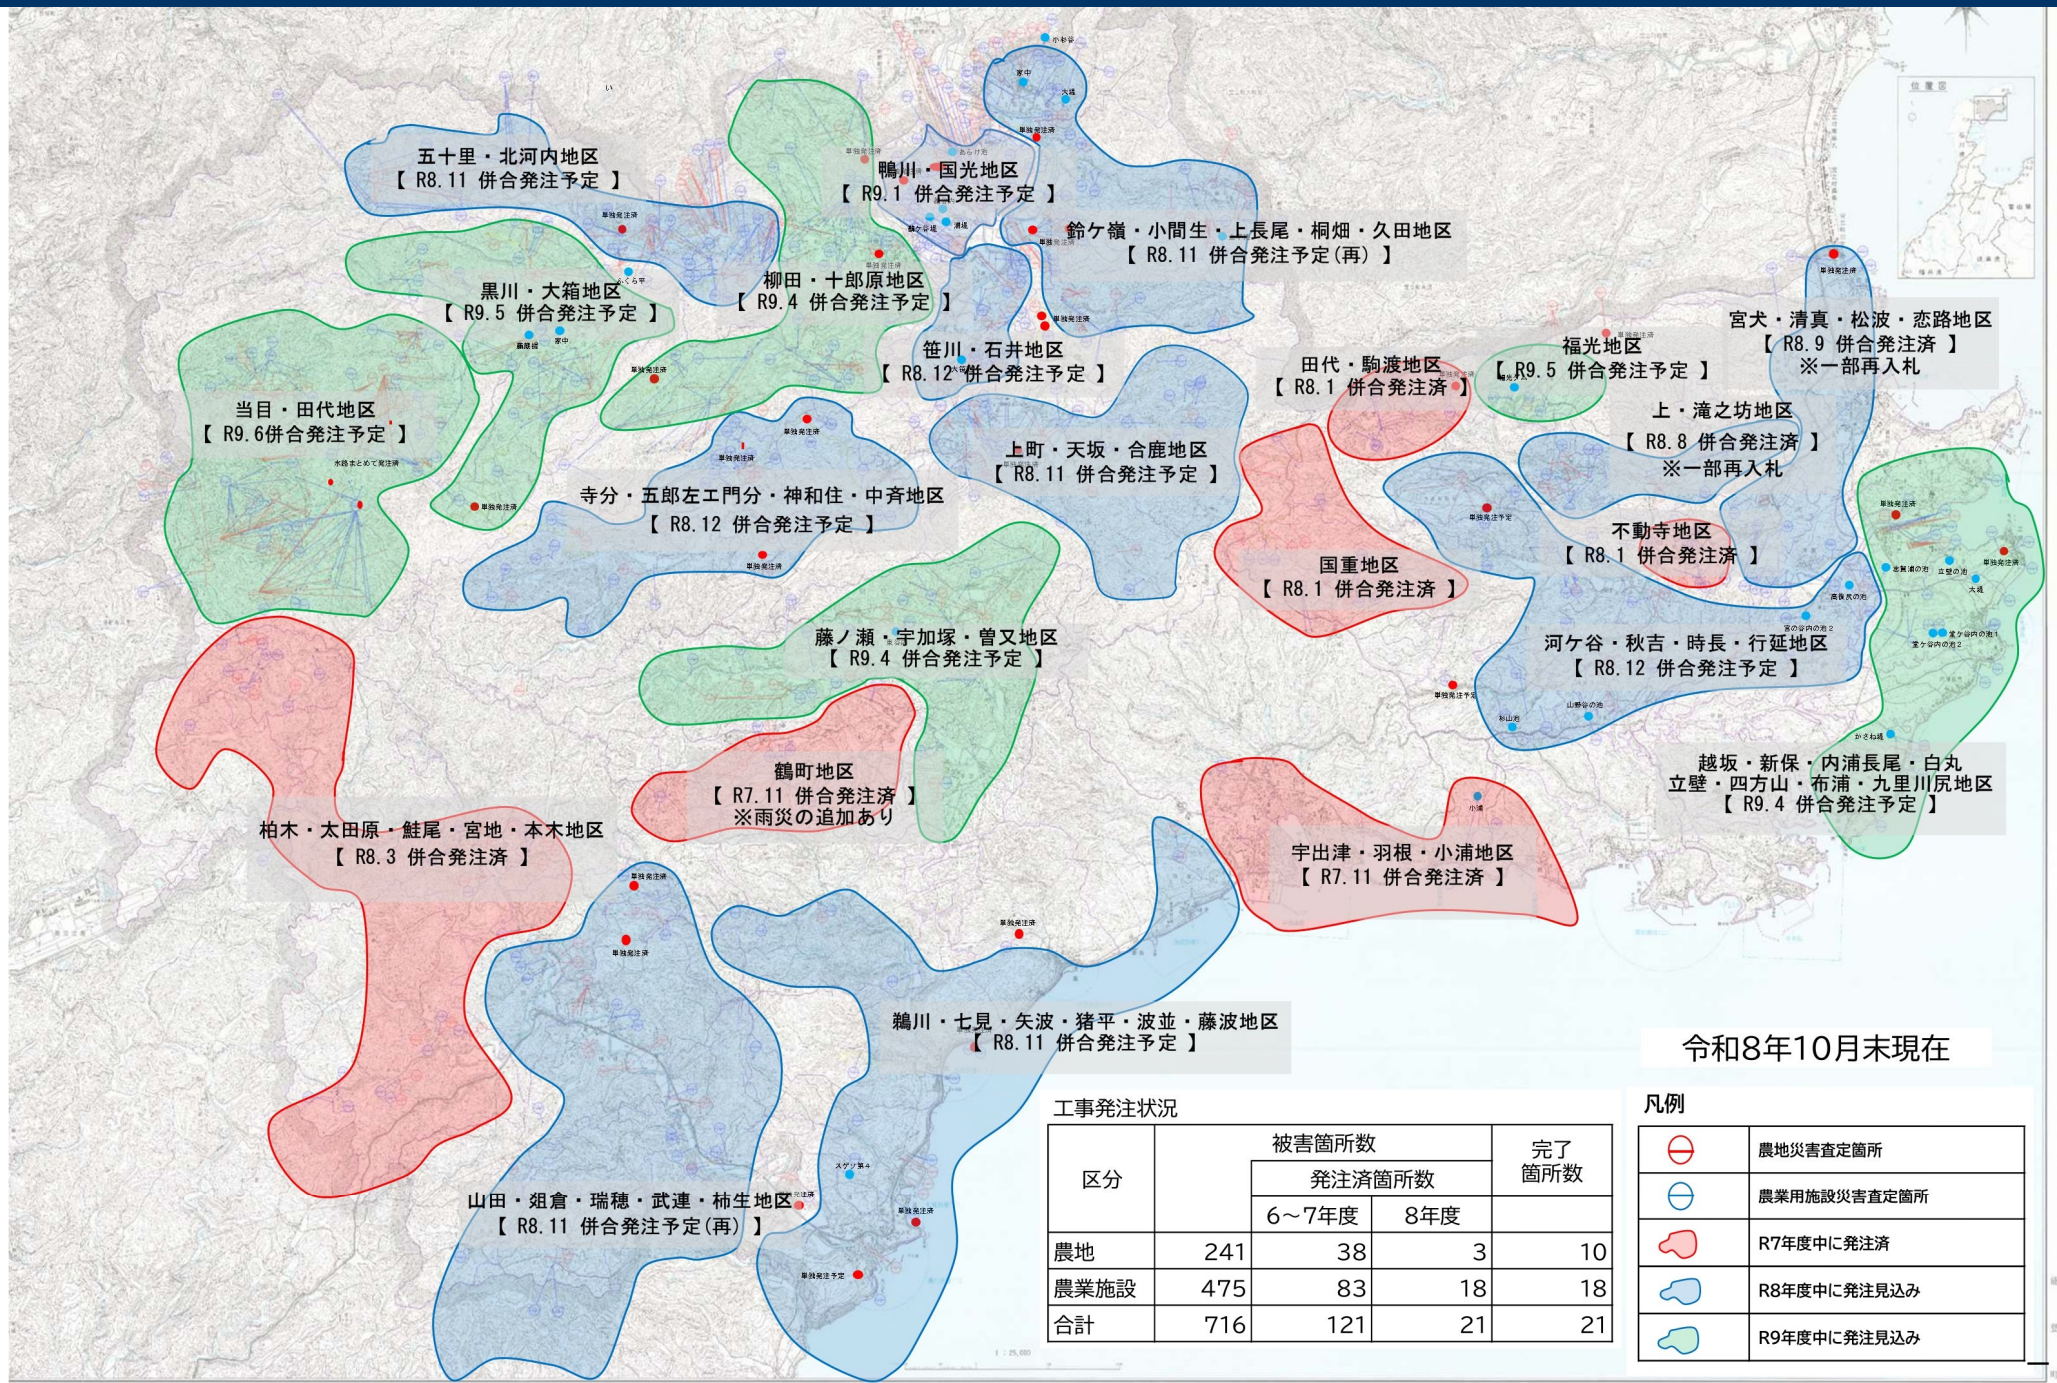


令和8年10月末現在


工事発注状況

| 区分 | 被害箇所数 | 発注済箇所数 | | 完了箇所数 |
|---|---|---|---|---|
| | | 6～7年度 | 8年度 | |
| 農地 | 241 | 38 | 3 | 10 |
| 農業施設 | 475 | 83 | 18 | 18 |
| 合計 | 716 | 121 | 21 | 21 |


凡例

| | |
|---|---|
| | 農地災害査定箇所 |
| | 農業用施設災害査定箇所 |
| | R7年度中に発注済 |
| | R8年度中に発注見込み |
| | R9年度中に発注見込み |

# 林道　災害復旧路線位置図

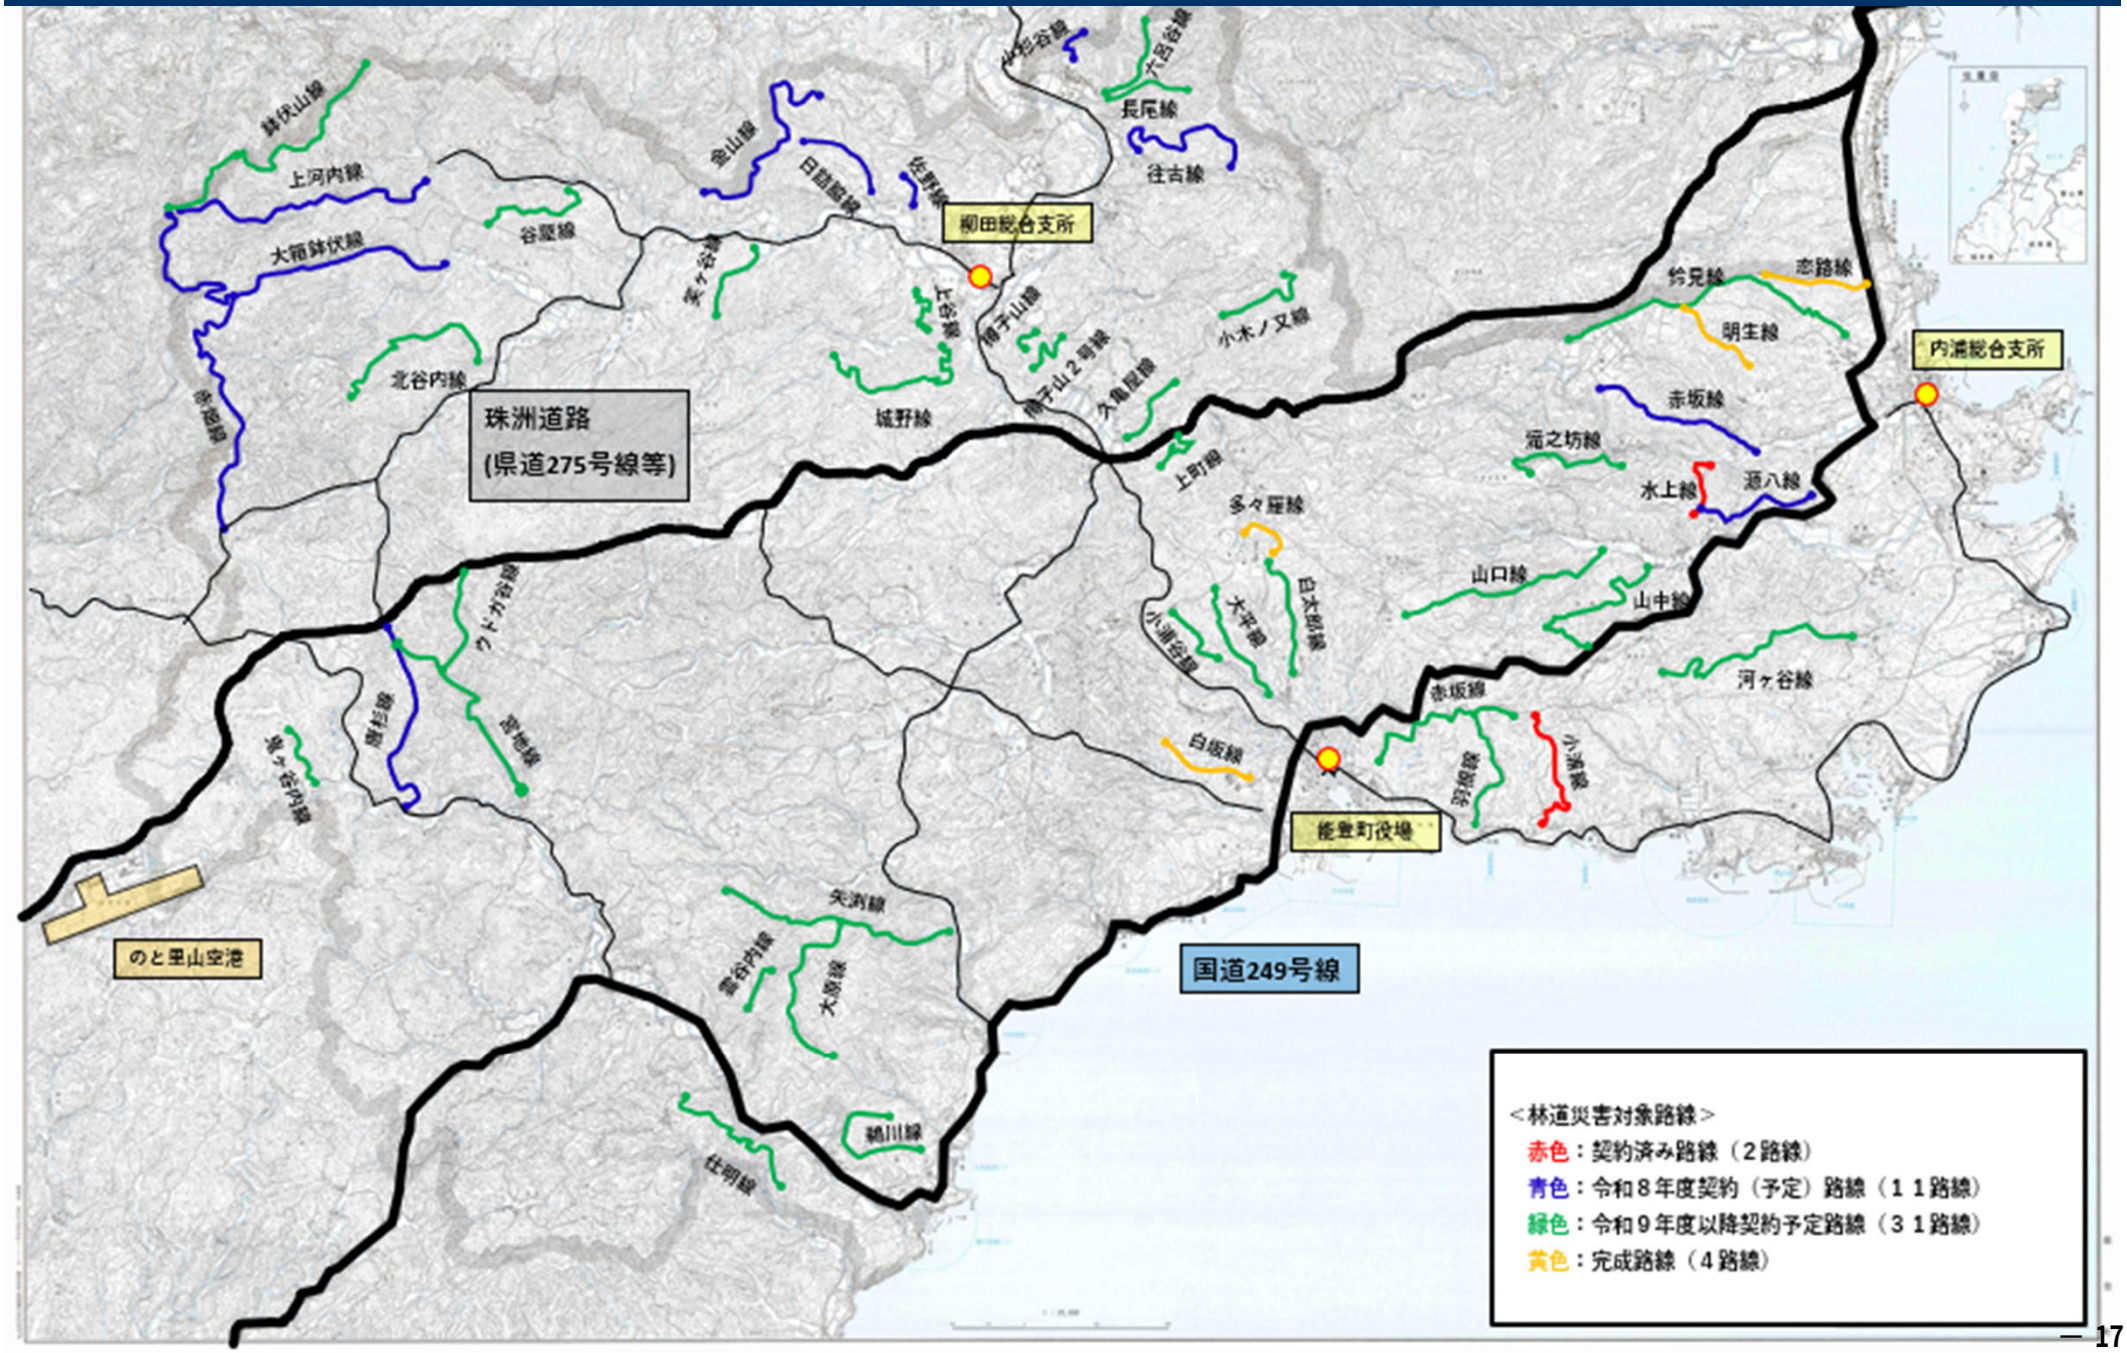

# 治山　災害復旧工事位置図（34か所）

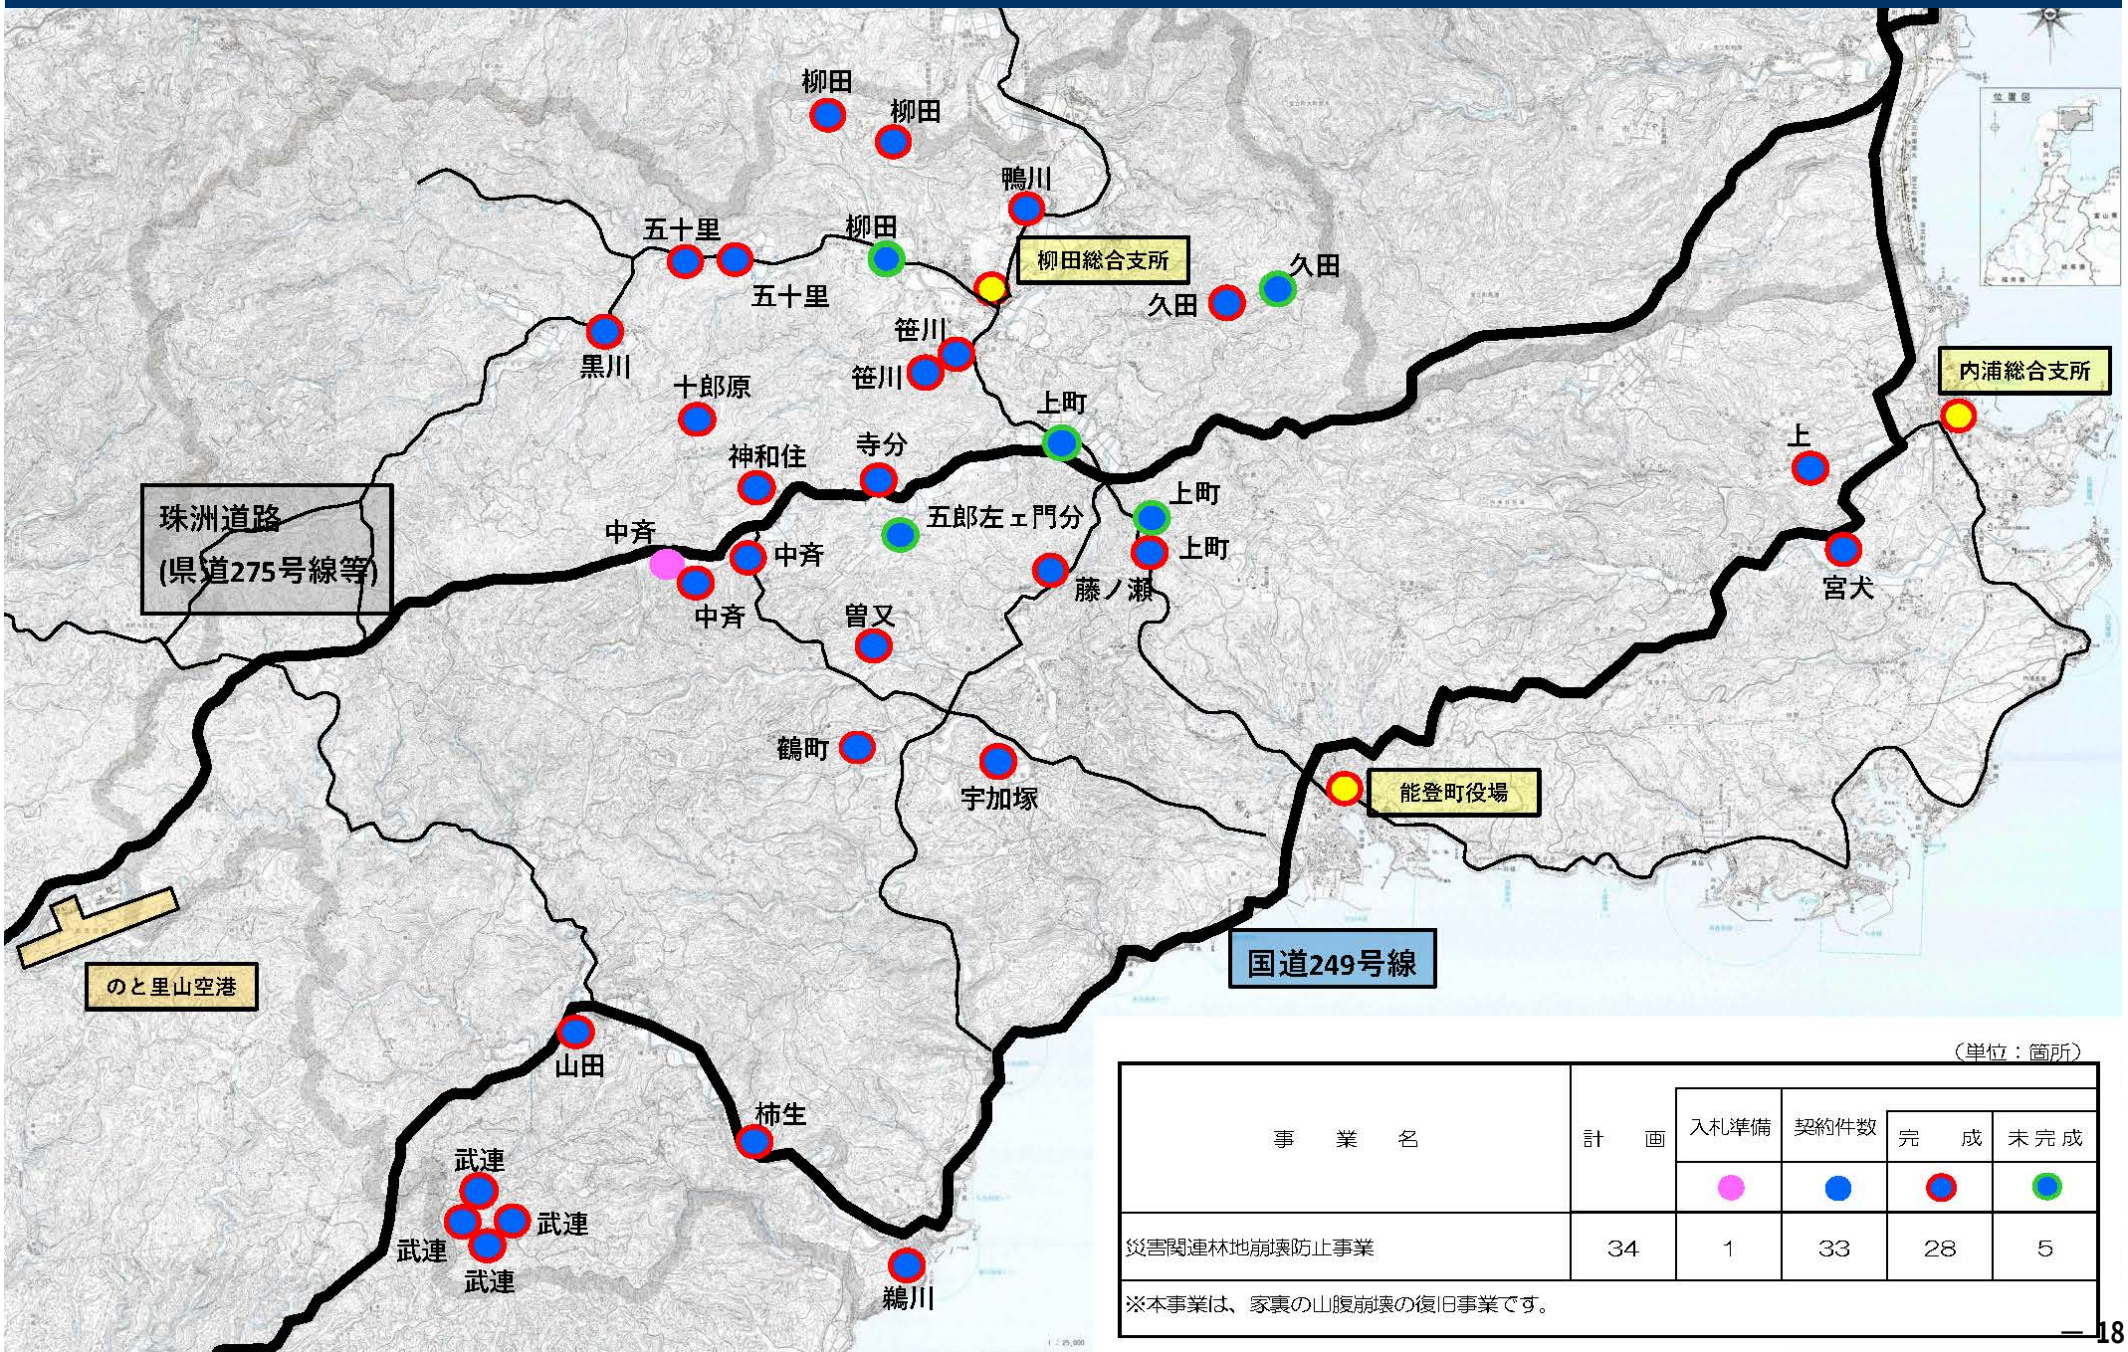


（単位：箇所）

| 事　業　名 | 計　画 | 入札準備 | 契約件数 | 完　成 | 未完成 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ● | ● | ● | ● |
| 災害関連林地崩壊防止事業 | 34 | 1 | 33 | 28 | 5 |
| ※本事業は、家裏の山腹崩壊の復旧事業です。 | | | | | |

# 漁港施設一覧

| 校区別 | 施設名 | 完了予定時期 | 整備状況（令和8年10月末現在） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事完了 | 工事施工中 | 今後発注予定 | 計 |
| 宇出津 | 小浦漁港 | 令和8年度 | | 9箇所 | | 9箇所 |
| | 羽根漁港 | 令和8年度 | 6箇所 | | | 6箇所 |
| | 藤波漁港 | 令和10年第1四半期 | 5箇所 | 4箇所 | 7箇所 | 16箇所 |
| 鵜　川 | 鵜川漁港 | 令和10年第1四半期 | 1箇所 | 15箇所 | 2箇所 | 18箇所 |
| | 七見漁港 | 令和10年第3四半期 | | | 16箇所 | 16箇所 |
| | 矢波漁港 | 令和10年第1四半期 | 2箇所 | | 5箇所 | 7箇所 |
| | 波並漁港 | 令和10年第1四半期 | 3箇所 | | 6箇所 | 9箇所 |
| 松　波 | 松波漁港 | 令和9年度 | | 7箇所 | 24箇所 | 31箇所 |
| | 白丸漁港 | 令和9年度 | 3箇所 | 3箇所 | 4箇所 | 10箇所 |
| | 比那漁港 | 令和9年度 | 2箇所 | 14箇所 | 2箇所 | 18箇所 |
| 計 | | | 22箇所<br>（15.7%） | 52箇所<br>（37.1%） | 66箇所<br>（47.2%） | 140箇所<br>（100.0%） |


①-3

# 教育施設の
# 復旧・復興見通しについて

# （教育委員会事務局）

# 小 学 校 施 設

| 施　設　名 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度以降 |
|---|---|---|---|
| 宇出津小学校 | 復旧工事完了（令和7年度） | | |
| 鵜川小学校 | 復旧工事完了（令和8年度） | | |
| 柳田小学校 | 復旧工事完了（令和8年度） | | |
| 小木小学校 | 復旧工事完了（令和7年度） | | |
| 松波小学校 | 新　築　工　事<br>（令和9年8月竣工予定）<br>旧校舎解体工事<br>仮設校舎<br>解体工事<br>ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備工事 | | |
| | ・新築工事起工式　　：令和8年6月17日<br>・旧校舎解体工事完了：令和8年10月2日<br>・新築工事開始後は、旧校舎のグラウンド（復旧済）を使用している。<br>・新校舎竣工後、仮設校舎を解体し、跡地にグラウンドを整備する。 | | |

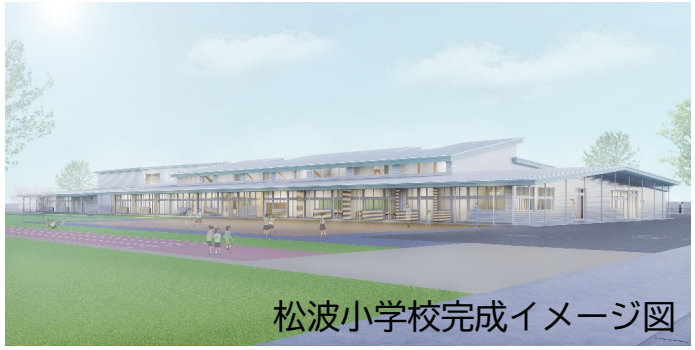

松波小学校完成イメージ図



# 中 学 校 施 設

| 施　設　名 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度以降 |
|---|---|---|---|
| 能都中学校 | 復旧工事完了（令和7年度） | | |
| 能都中学校（小木校舎） | 復旧工事完了（令和7年度） | | |
| 柳田中学校 | 外構復旧工事<br>（令和8年12月完成予定） | | |
| | 復旧工事完了（令和7年度）　※ 校舎・体育館 | | |
| 松波中学校 | 復旧工事完了（令和8年度） | | |

# 公 民 館 施 設

| 施　設　名 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度以降 |
|---|---|---|---|
| 秋吉公民館 | 新築工事（令和9年3月竣工予定）<br>解　体　工　事 | | |
| | 入札不調により着工が遅れ、また、資材不足等で工事の遅延が懸念される。 | | |
| 不動寺公民館 | 解体工事（公民館棟） | 新　築　工　事（令和10年3月竣工予定） | 解体工事（保育園棟） |
| | 入札不調や建設費の上昇、資材不足等が懸念される。 | | |
| 高倉公民館 | 実施設計業務（令和9年3月完了予定） | 解体工事（保育園棟）<br>新　築　工　事（令和10年度竣工予定） | 解体工事（公民館棟） |
| | 保育園棟を解体し、跡地に新公民館を建設する。 | | |
| 鵜川・瑞穂・神野岩井戸公民館 | 昭和40～50年代に建てられ、新耐震基準（昭和56年6月以降）を満たしていない公民館の建て替えを進めるとともに、能登半島地震により被災した公民館の早期復旧と機能強化を図る。<br>建て替え計画：瑞穂（R10）、鵜川（R11）、神野（R12）、岩井戸（R13） | | |

# 社 会 体 育 施 設

| 施 設 名 | 現在の状況 | 代替措置 | 今後の方向性 |
|---|---|---|---|
| 能都体育館 | 閉　館<br>（体育施設等の再配置や集約化及び事業の可能性を調査中） | 学校体育館等を一般開放<br>・能都第二<br>・柳田小学校<br>・能都中学校小木校舎 | ○ 新耐震基準（昭和56年6月以降建築）を満たしていない施設は除却し機能を集約化する。<br>・内浦体育館<br>・能都体育館<br>・柳田体育館<br>・内浦ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ<br>・雄志館<br>○ 屋内プールの整備を進める。 |
| 柳田体育館 | | | |
| 内浦体育館 | | | |

①-4

# 児童施設の
# 復旧・復興見通しについて

# （健康福祉課）

# 児童施設

| 施設名 | R8 年度 | R9 年度 | R10 年度 以降 |
|---|---|---|---|
| こどもみらいセンター | 設計・建設工事<br>令和８年度中に復旧工事完成予定。 | | |
| まつなみキッズセンター | 設計・建設工事 | 解体工事 | |
| | 令和8年度より新築(改築)工事を行い、令和9年度中に完成予定。<br>現施設は新施設供用開始後に解体工事を行う予定。 | | |



まつなみキッズセンター完成イメージ図

①-5

# 復興公営住宅の整備について

（復興住宅課）

# 復興公営住宅の基本的な整備の考え方（全体計画）

| | |
|---|---|
| 整備方針 | 『能登町復興計画』（令和７年２月策定）で定める「再生と創造に向けた５つの柱」の分野別取組「くらしと地域コミュニティの再建」に位置づける「復興（災害）公営住宅の整備」を達成するため、「石川県復興公営住宅整備指針」を基に、**地域特性や新しいコミュニティ形成、高齢者・障がい者等に配慮し**つつ、**安全・安心な生活環境**が持続する、良質な住まい（復興公営住宅）を供給するものです。 |
| 全体計画の目　標 | 整備計画期間は能登町復興計画を基に、被災世帯のニーズに対し過不足のない復興公営住宅を早期に整備します。 |
| 考 え 方 | 被災者ニーズとともに、能登町の都市構造や公的住宅ストックの状況および将来の住宅需要を見越して、地区別の供給戸数を計画します。 |
| 既存公的住宅戸　数 | 215 戸　（令和８年９月時点 用途廃止予定を除く） |
| 整備計画戸　数 | 257 戸　（令和８年６月～７月に受付した申込登録の結果） |


# 復興公営住宅一覧

2026.10. 9時点

| 校区別 | 施設名【建設(予定)地】 | 計画戸数 | 住戸形式 | 入居時期(予定) | 整備状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇出津 | 宇出津第1団地 【旧しらさぎ保育所】 | 30 | 中層共同 | 令和9年5月 | 工事中 |
| | 宇出津第2団地 【漆原集会所付近】 | 26 | 低層長屋 | 令和11年4月 | 測量中 |
| 鵜 川 | 鵜川団地 【鵜川支所裏農地団地】 | 27 | 低層長屋 | 令和11年4月 | 測量中 |
| | 瑞穂団地 【旧瑞穂小中学校跡地】 | 9 | 低層長屋 | 令和10年4月 | 設計中 |
| 柳 田 | 柳田第1団地 【珠洲道路天坂・五郎左工門分】 | 46 | 低層長屋 | 令和10年4月 | 造成中 |
| | 柳田第2団地 【応急仮設やなぎだ第1団地】 | 19 | 低層長屋 | 令和11年4月 | 整備前(他団地完成後) |
| 松 波 | 松波第1団地 【旧サロニカ駐車場跡地】 | 27 | 中層共同 | 令和9年4月 | 工事中 |
| | 松波第2団地 【旧シメノドラッグ跡地】 | 24 | 低層長屋 | 令和10年4月 | 設計中 |
| | 松波第3団地 【応急仮設まつなみ第2団地】 | 11 | 低層長屋 | 令和11年4月 | 整備前(他団地完成後) |
| | 白丸団地 【白丸高台】 | 16 | 低層長屋 | 令和10年4月 | 設計中 |
| 小 木 | 小木第1団地 【小木旧マルゲン跡地】 | 11 | 低層長屋 | 令和10年4月 | 設計中 |
| | 小木第2団地 【小木新町】 | 11 | 低層長屋 | 令和11年4月 | 用地交渉中 |
| 合 計 | 12団地 | 257 | | | |

# 松波校区 | 団地全域

2026.10.30時点

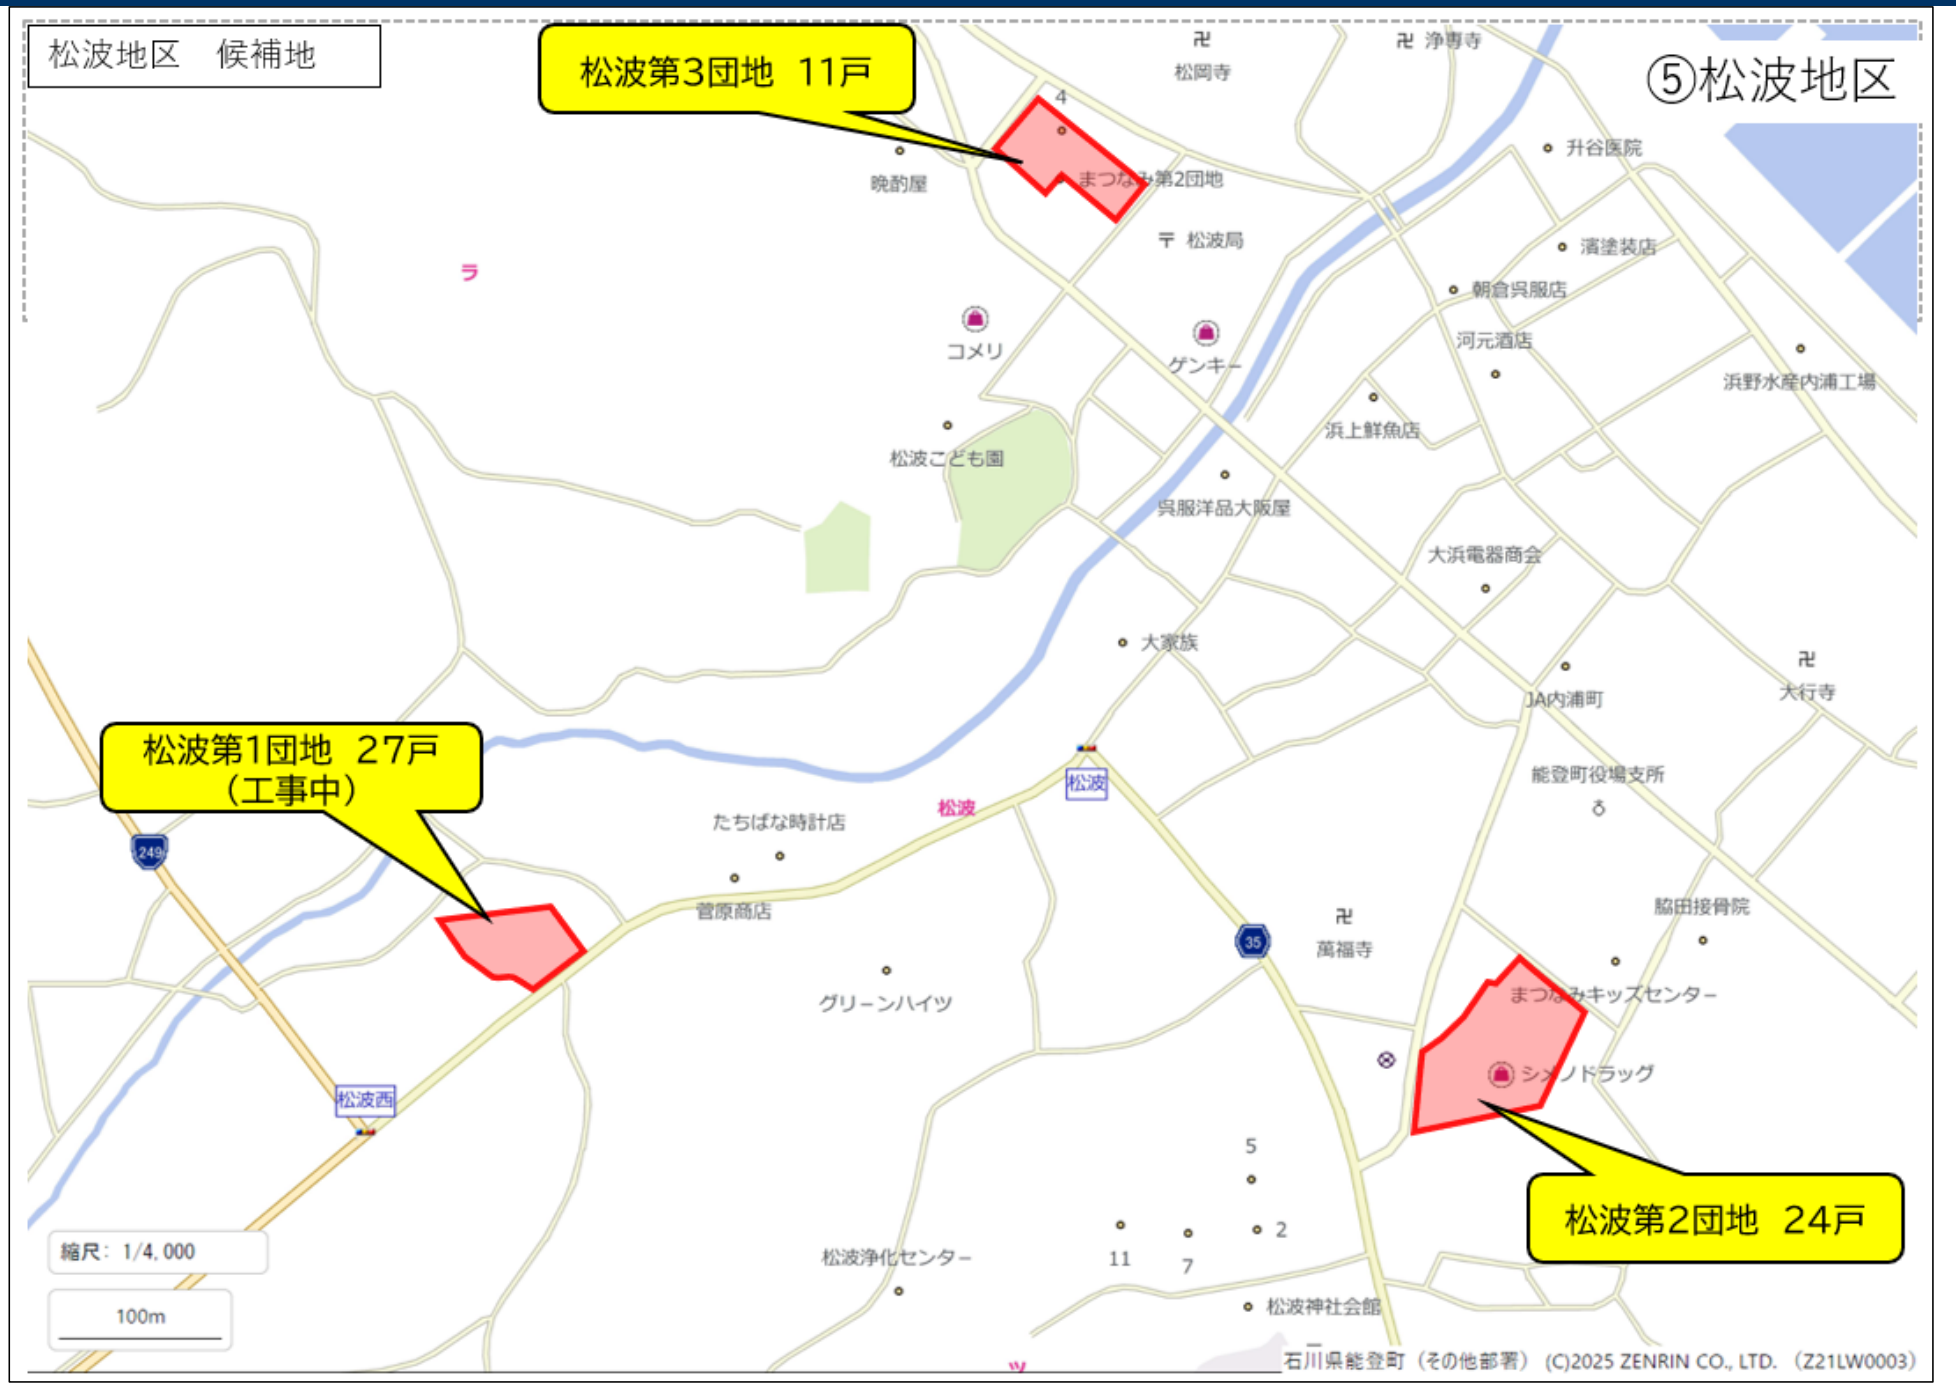

# 松波第１団地（旧サロニカ駐車場跡地）



松波第1団地　完成イメージ図


松波第1団地　27戸
（工事中）

縮尺：1/1,500


40m

石川県能登町（その他部署）(C)2025 ZENRIN CO., LTD.（Z21LW0003）

# 松波第２団地（旧シメノドラッグ跡地）

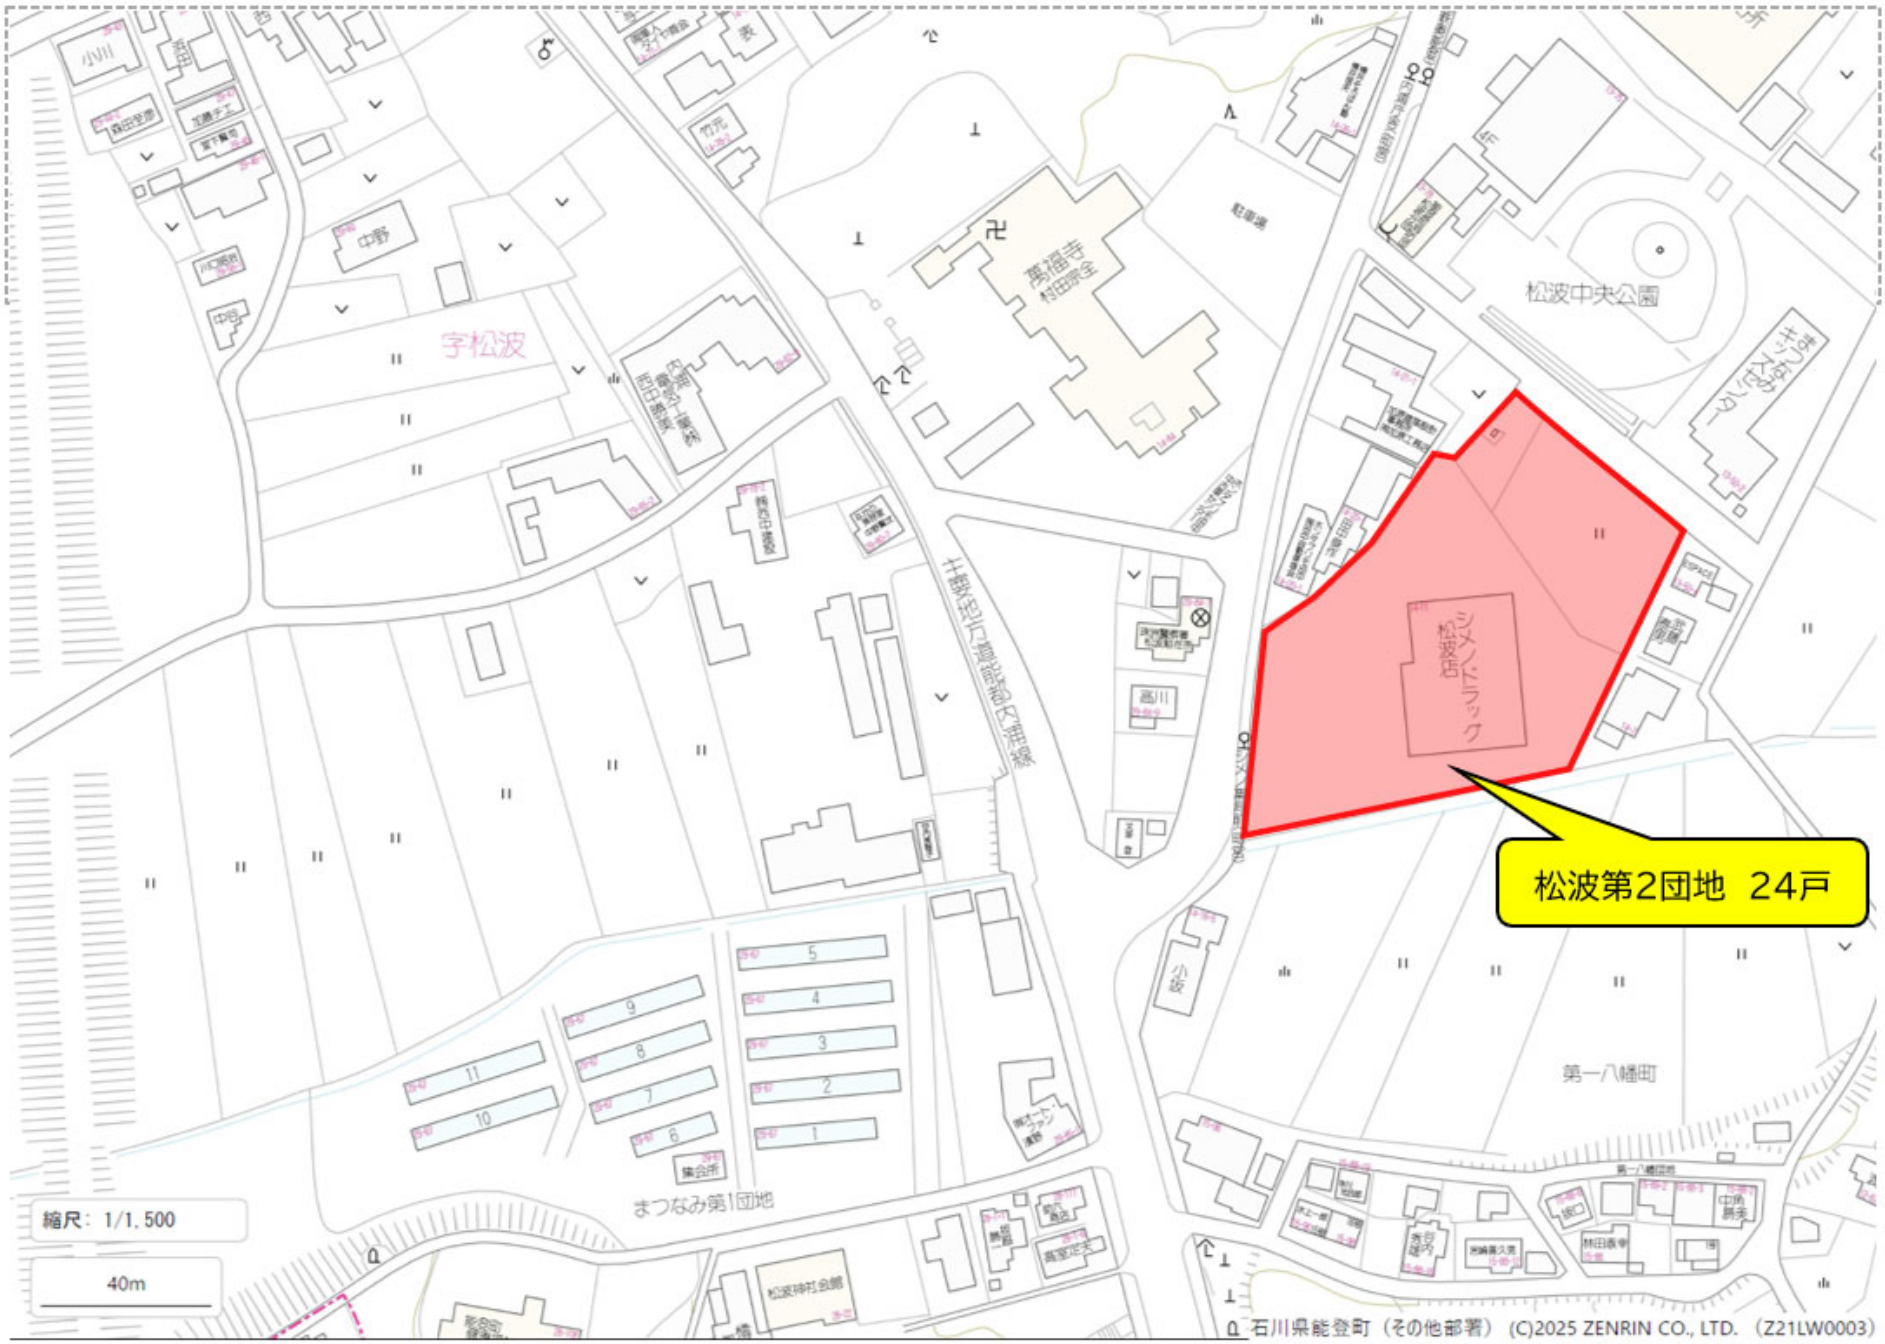


# 松波第３団地（仮設まつなみ第２団地跡地）

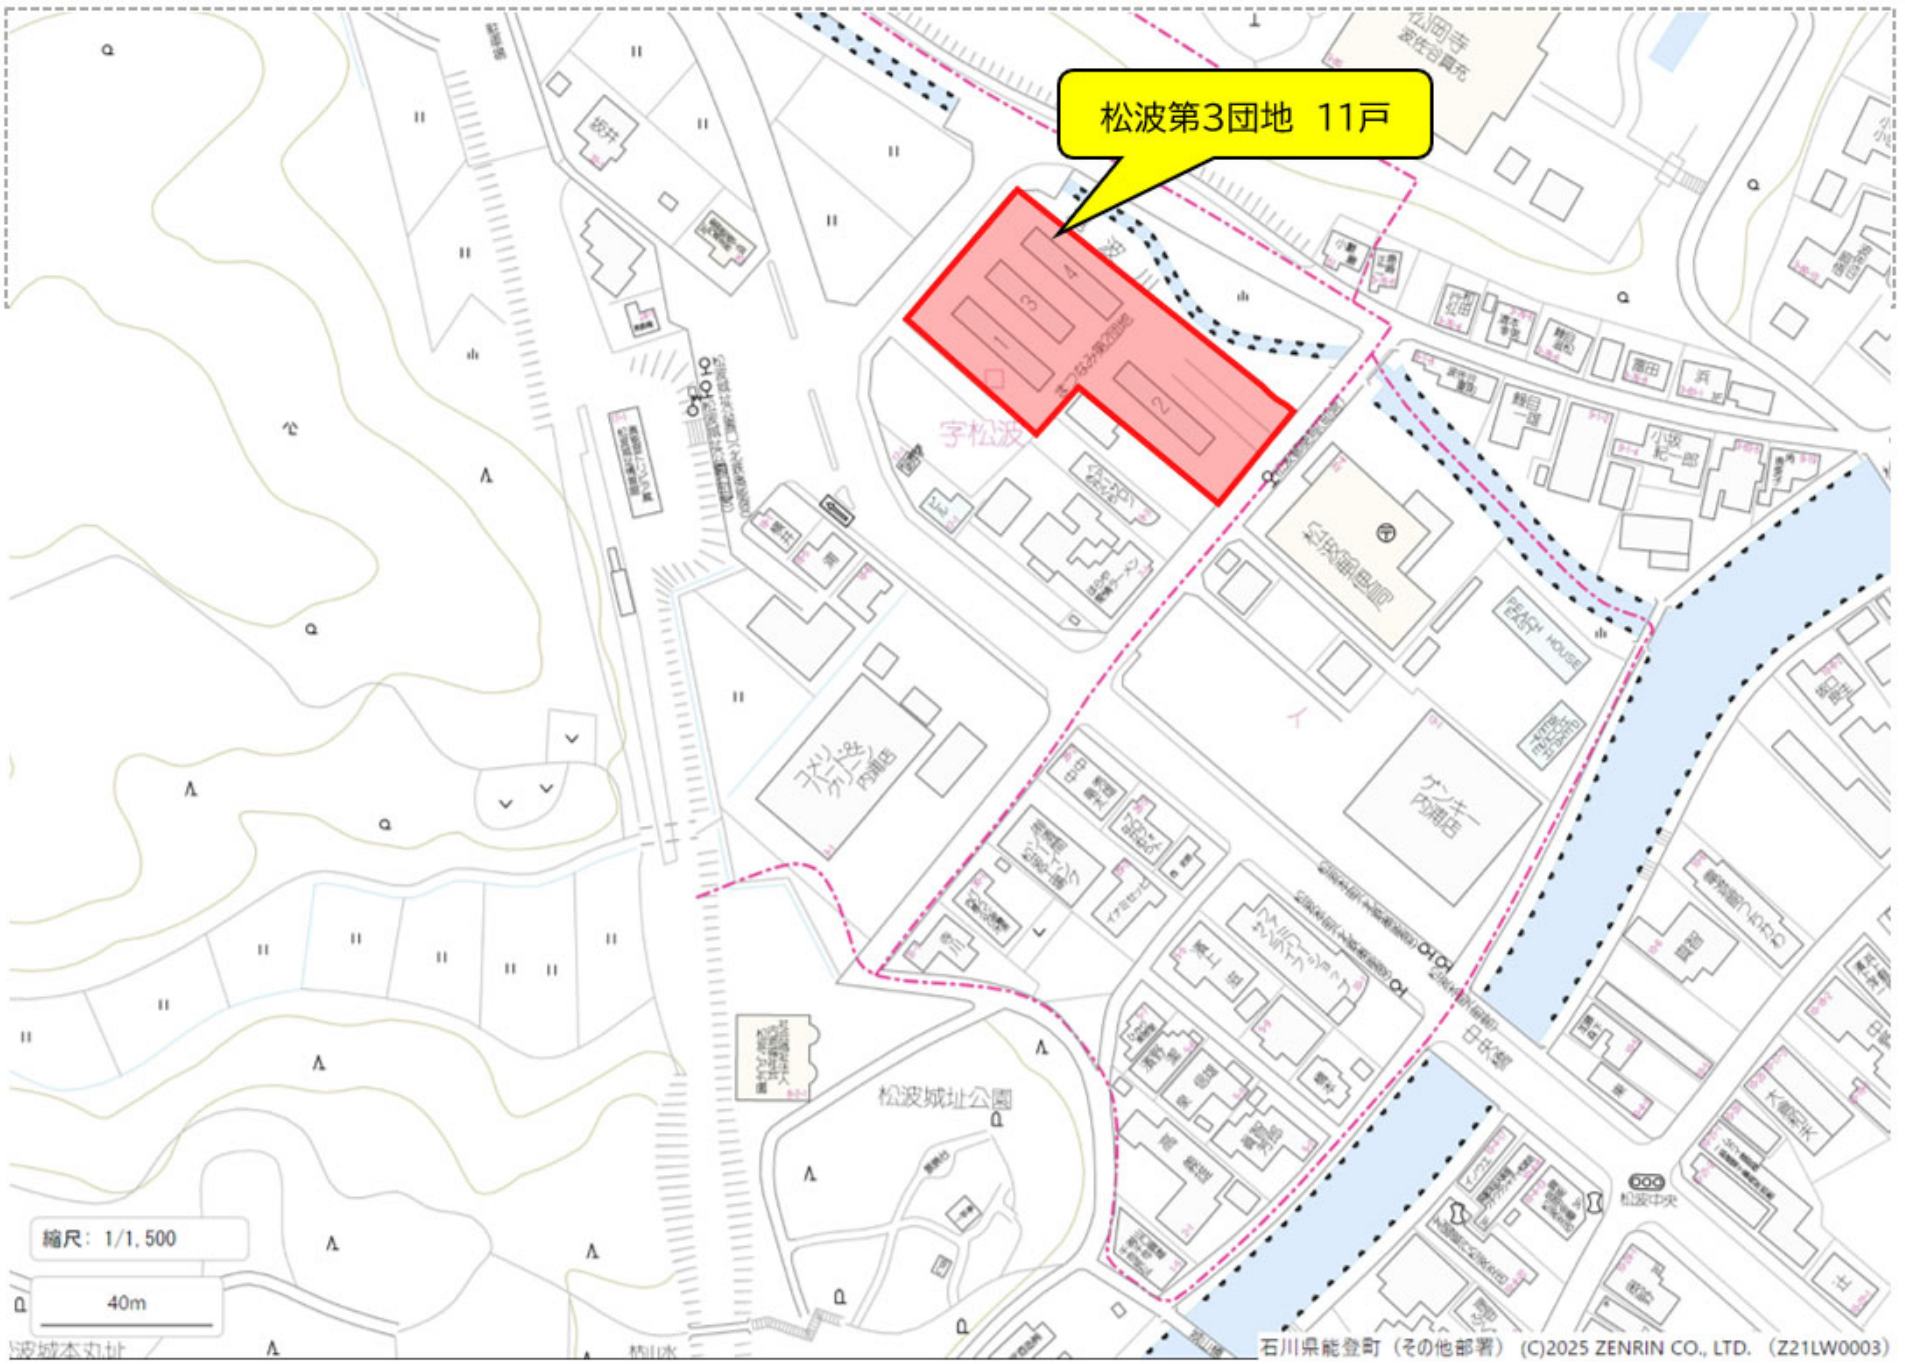

# 松波校区｜白丸団地（仮設しろまる団地周辺）

2026.10.30時点

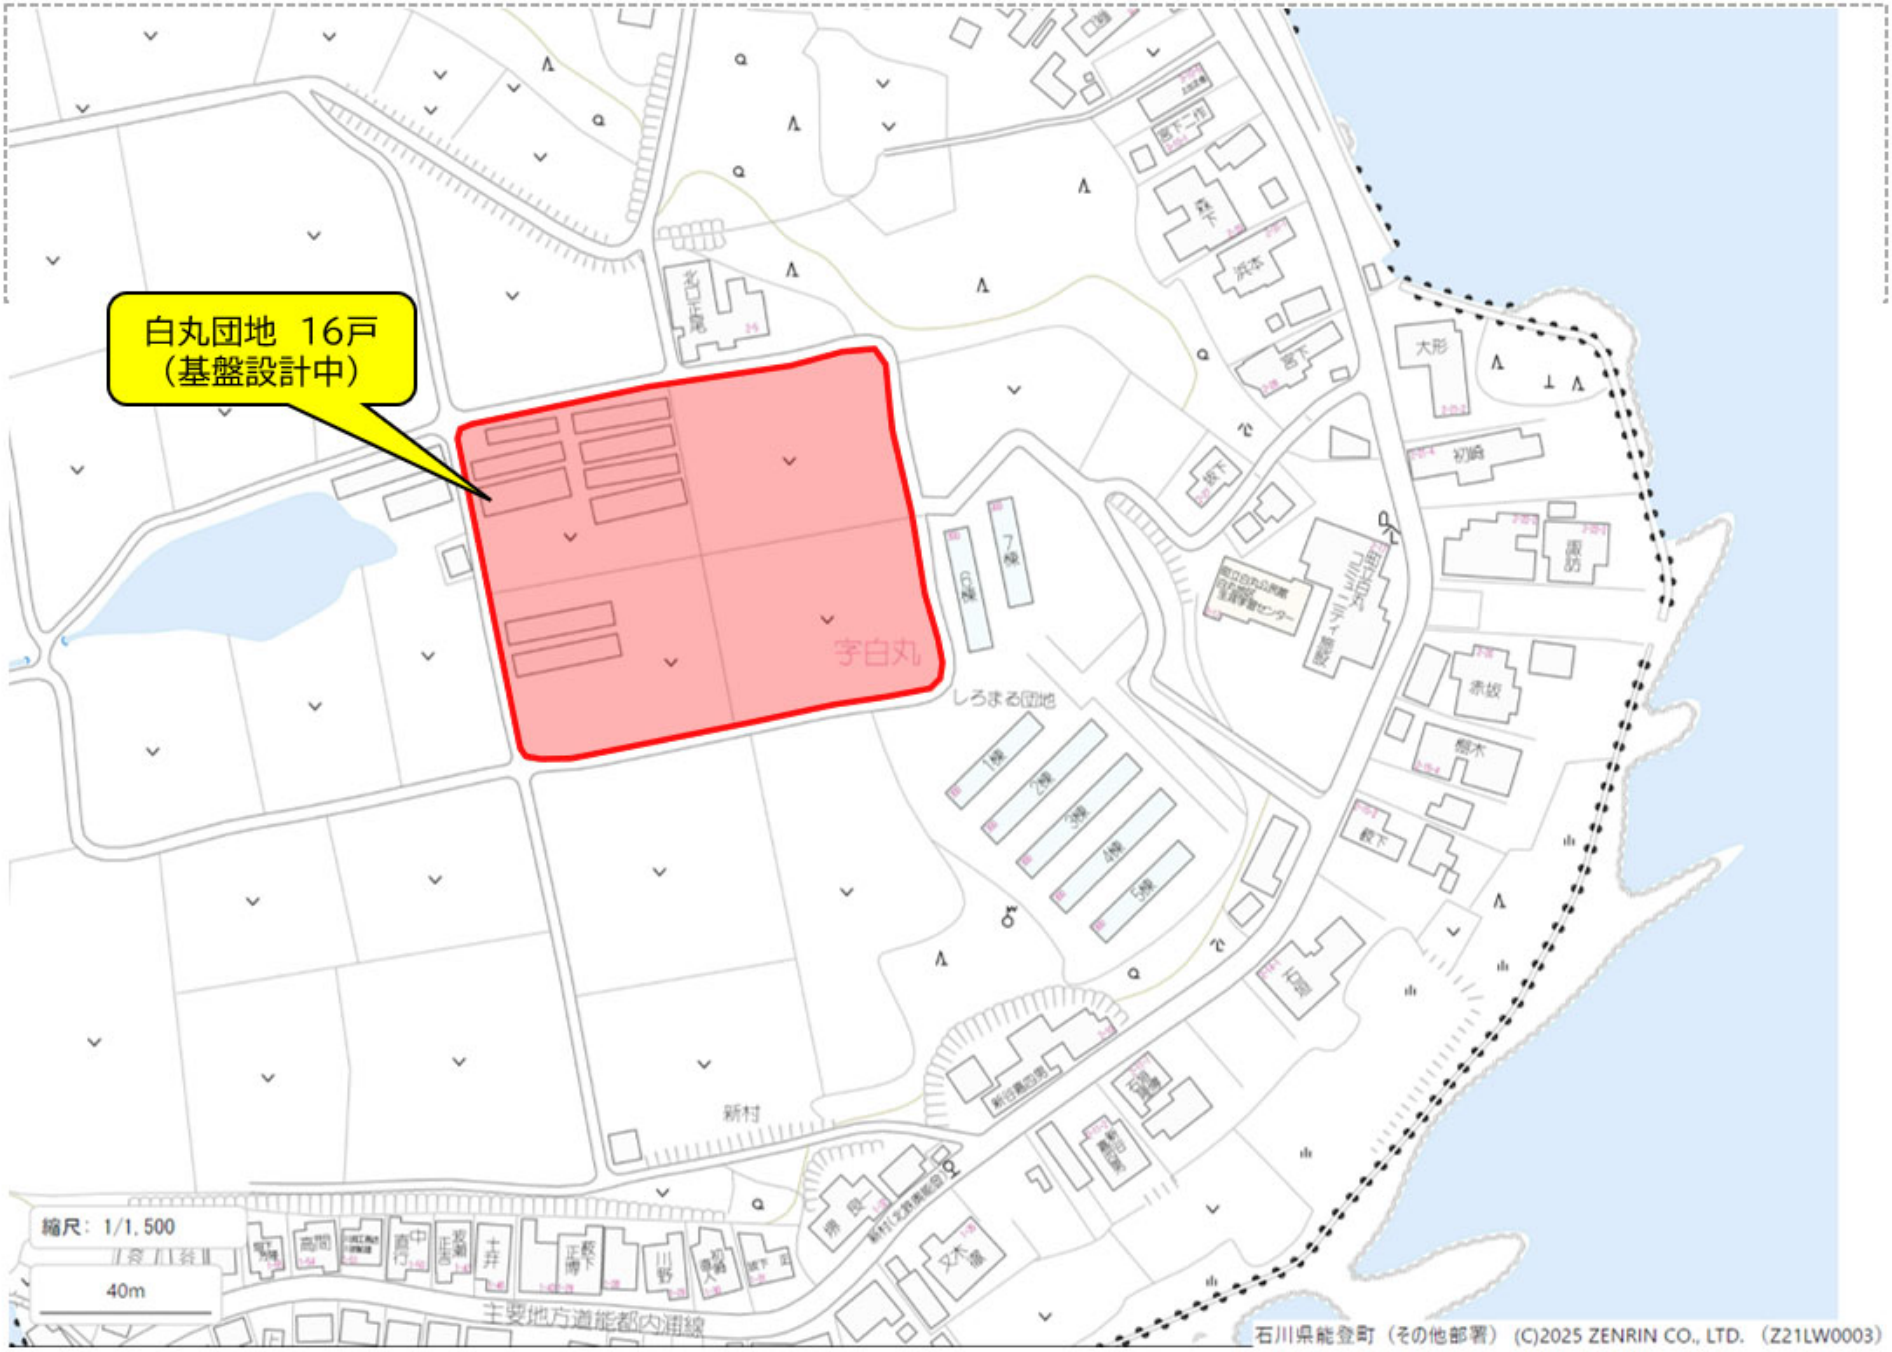

②

# 町復興計画における復旧期の進捗について

（復興推進課）

# 計画期間

復旧・復興を実現するまでの期間は、県の創造的復興プランの計画期間にあわせ、9年間としています。
また、将来の本町の姿をイメージできるよう、この計画期間を、**復旧期、再生期、創造期**に分け、それぞれの期間ごとに目標を設定し、取り組んでおり、このたび、**復旧期【2年間】（令和6年度～令和7年度）の2年間が経過**したことを踏まえ進捗状況を評価しましたので次のとおり公表します。

## 計画期間


▶ **復旧期【2年間】（令和6年度～令和7年度）**
　生活や産業の再開に不可欠な住宅、生活環境、インフラ等の早期復旧に加え、事業継続と雇用の維持を重点的に進めます。

▶ **再生期【3年間】（令和8年度～令和10年度）**
　復旧期と連動し、生活環境や生業の本格復旧を進めるとともに、防災・減災を推進し、強靭かつ持続可能なまちづくりを進めます。

▶ **創造期【4年間】（令和11年度～令和14年度）**
　再生期と連動し、復興を進めるとともに、地域の新たな魅力や活力、賑わいの創出など、次世代に受け継ぎ、価値を創造する創造的復興を進めます

## タイムライン（進捗計画）

いつまでに、何をするのかといった取組の流れや進捗を示した工程表

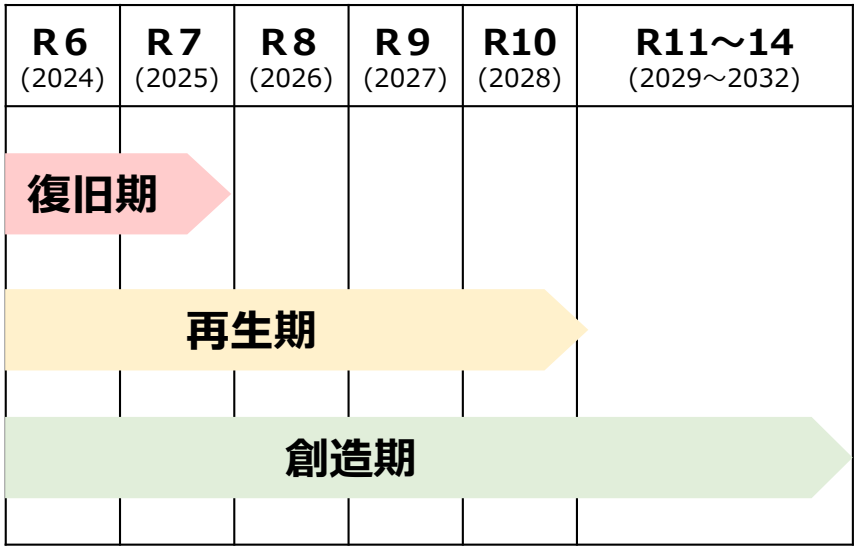

# 進捗評価（復旧期）

| 再生と創造に向けた施策の柱 | 施策数(※) | A | B | C | 評価なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.インフラの早期再生と強靭化 | 52【うち完了6】 | 3 | 23 | 22(40.4%) | 4 |
| 2.くらしと地域コミュニティの再建 | 46【うち完了3】 | 1 | 34 | 7(15.2%) | 4 |
| 3.生業(なりわい)の再建 | 49【うち完了3】 | 3 | 34 | 7(14.3%) | 5 |
| 4.安心してくらし続けられるまちづくり | 82【うち完了3】 | 6 | 58 | 11(12.2%) | 7 |
| 5.復興プロジェクトの創出 | 18【うち完了0】 | 1 | 14 | 2(11.1%) | 1 |
| 計 | 247【うち完了15】 | 14(5.7%) | 163(66.0%) | 49(19.8%) | 21 |

(※)本編の「復興に向けた主な取組」における実施予定事業及び検討中の事業を整理した事業であり、今後も、社会情勢の変化や財政状況等を踏まえ、追加・修正・変更を行います。

| 区　分 | 主な内容・判断基準 |
|---|---|
| A　計画以上 | 計画以上の成果、前倒しでの開始や目的を達成したもの |
| B　計画どおり | 計画どおりに順調に進捗しているもの、完了したもの |
| C　一層の取組が必要 | 執行率80%未満、または取組の加速・改善が必要<br>始まったばかりで今後の成果が求められるもの |
| 評価なし | 復旧期未計画、または再生期(令和8年度)以降の取組で成果のないもの |

# 進捗評価（C評価事業について）

1. 総括

現在、被災したインフラや生活基盤の「原形復旧」を最優先としつつ、未来を見据えた「まちの再生」へ向けた過渡期にあります。今回整理した「一層の取組が必要な事業」については、主に「地元業者の不足」、「資機材供給の不安定さ」、「用地交渉等の手続きの難航」「社会状況の流動化」という複合的要因により、計画に遅れが生じています。

今後は、単なる遅延への対処にとどまらず、現場の状況に即した工法の見直しや、庁内横断的な連携、専門知見の導入を徹底し、実効性の高い計画へ最適化してまいります。

2. 分野別進捗状況と今後の方針

| 再生と創造に向けた施策の柱 | 現状 | 今後の対応方針 |
|---|---|---|
| **1.インフラの早期再生と強靭化** | ・測量・設計の遅延<br>・地元業者不足<br>・資機材調達の困難 | ・インフラの復旧は住民生活および地域経済の基盤です。<br>・分離発注等の工夫や、関係機関との連携強化により、着実な完了を目指します。 |
| **2.くらしと地域コミュニティの再建** | ・崖地・地すべり等の用地交渉の難航<br>・個別生活再建の課題 | ・安全を最優先に、専門家のサポートや制度の見直しを進めます。<br>・町民の皆様が日常を取り戻し、地域活動が再び活発に行われる環境づくりに努めます。 |
| **3.生業（なりわい）の再建** | ・業者不足による施設再取得の遅れ<br>・観光・商業ニーズの不透明さ | ・被災からの復興は、原形復旧にとどまらず、新しい経済の形を模索するチャンスでもあります。<br>・事業者との対話を重ね、ニーズにあった現実的な解決策を一つずつ実行し、力強い「なりわい」の再興につなげます。 |
| **4.安心してくらし続けられるまちづくり** | ・施設整備の入札不調<br>・将来の施設利用計画の策定 | ・「安心してくらし続けられる」という目標には、物理的な施設再生はもちろんのこと、非常時に確実な情報が届き、誰もが支え合える環境が必要なため、復旧と並行して、これからの町に必要な「暮らしの仕組み」を、関係部署が一体となって作り上げます。 |
| **5.復興プロジェクトの創出** | ・交流拠点（ノト クロスポート）の主体形成<br>・医療体制の再編 | ・復興プロジェクトは、町の未来を左右する試金石です。<br>・課題を先送りにせず、復興の先にある、「持続可能で魅力的な町づくり」を具体化します。 |

町民自らが考え･行動するプロジェクトを応援！

# 能登町復興まちづくり活動支援補助金

町民の皆様が主体となって進める「復興まちづくり」の独自 企画や実践的な取り組みを力強く後押しします！

## 1 補助の目的

地域のコミュニティ力を高め、復興に向けた勉強会や研修会など、町民の皆様が自らスキルや力をつけるための実践的な活動を支援します。

## 2 補助内容

補助率
**全額**
1,000円未満切り捨て

補助上限額
**30万円**
1事業につき

【回数制限】
1事業につき年度1回限り
（通算2回まで）

## 3 対象となる団体

・町内に活動拠点を持っていること
・5人以上で構成（代表者および構成員の過半数が町内に在住･居住）
・政治･宗教･営利活動を目的としないこと
・特定の個人や団体の利益のみを目的としないこと

## 4 対象となる事業

能登町総合計画や復興計画の目標達成に資する事業

【対象事業の例】
・住民向け勉強会や研修会の開催
・まちづくりワークショップ
・地域課題解決の実践プロジェクト

【対象外】
経常的な運営経費（家賃･人件費等）、営利事業、施設整備、他補助金との重複経費

## 5 申請から交付の流れ

**Step 1** 事業着手前の 事前申請
事業計画書･収支予算書等の提出

**Step 2** 審査･決定通知
内容を審査し決定通知書を送付

**Step 3** 事業実施･実績報告
完了後に実績報告書を提出

**Step4** 補助金の 交付
額を確定した後に交付

【ご注意いただきたいこと】
・本補助金は団体の「運営費」の補填ではなく、まちづくりを促進する「企画･事業」そのものに要する経費が対象です。
・必ず事業実施前の申請が必要です。

# 意見交換

01 インフラ施設別復旧の見通しについて

02 町復興計画（復旧期）の進捗状況について

③

# 地区別復興まちづくり計画
# 主要事業について

# 復興まちづくり計画（松波地区）

## 目指すべき将来像

**内浦の豊かな自然と祭りの心が、世代を超えて“わくわく”を生み出す 松波**

内浦の里山里海の自然の豊かさや、歴史とともに受け継がれた集落ごとの祭礼文化など、それぞれの地域が持つ個性を活かし、暮らしを楽しみながら住み続けられる地域づくりを目指します。
海辺の風景が美しいスポットや恋路海岸・五色ケ浜など海に親しむ地域資源が豊富であることを活かして、来訪者やさらには移住者も温かく迎え入れる地域づくりを目指します。
また、松波小学校の再建を復興の起点として、こども達を育むとともに、多様な世代が交流し支え合い、未来につながる“わくわく”する地域づくりを目指します。

## 基本目標

（1）地域の個性を活かし支え合うコミュニティづくり
（2）多様な世代が楽しみ挑戦できる暮らしづくり
（3）内浦の豊かな自然環境や歴史文化を活かした賑わいづくり

# 復興まちづくり計画（松波地区）

## 重点事業１　松波小学校・まつなみキッズセンター再建による子育てに重点を置いた環境整備

松波のまちなかは生活利便性が高く暮らしやすいと感じられており、さらに松波小学校・まつなみキッズセンター再建をきっかけとして、子育てしやすいまちづくり、こどもの居場所づくりが求められています。再建にあたり、こども・保護者のそれぞれの視点から求められる機能を検討し、子育てに重点を置いた施設整備及び周辺の環境整備を進めます。

**事業内容**

**①松波小学校の建替え**
現在、教育環境の早期復旧に向けて進めている学校の建替えに合わせて、広場空間の放課後や休日の活用方法について地域と一緒に検討する。

**②まつなみキッズセンターの建替え**
建替えにより規模の最適化を図りつつ、子育て支援ルーム、中高生のためのタイムシェアによる居場所づくりなど、こども・保護者の視点から期待される使い方等について利用者の意見を取り入れる。

**③こどものための周辺環境整備**
まつなみキッズセンターの建替えと合わせて、松波中央公園と一体的にこどもの居場所・遊び場となる屋外空間整備を進める。

**タイムライン**

| 項目 | 復旧期(R6～7) | 再生期(R8～10) | 創造期(R11～14) |
|---|---|---|---|
| ①松波小学校の建替え | 設計 → 工事 | | |
| ②まつなみキッズセンターの建替え | 設計 | 工事 | |
| ③こどものための周辺環境整備 | | 整備検討、設計・工事 | |

**役割**

**①松波小学校の建替え**
【行政】松波小学校新築事業の実施　【地域】広場空間の放課後や休日の活用方法の検討

**②まつなみキッズセンターの建替え**
【行政】まつなみキッズセンターの建替え事業の実施　【地域】新たな施設の使い方・機能の検討への参加

**③こどものための周辺環境整備**
【行政】まつなみキッズセンターの建替えに合わせた周辺環境整備


松波小学校

**今後の方針**

【教育委員会事務局】
①地域も利用しやすい学校として設計した学校整備を進めている（令和9年8月に完成予定）。学校敷地内の広場空間の活用等については、地域の意見を取り入れながら検討する。活用の推進も含め令和10年度より、松波小学校にコミュニティースクール制度を導入する。

【健康福祉課】
②③令和８年度に利用者及びその保護者を対象とした施設の使い方や機能についてのアンケート調査を実施。落ち着いて学習できるスペースやWi-Fi設備などのアンケートの意見も反映させて、令和９年度に供用開始予定。松波中央公園も整理し、遊びやすい空間を確保する。

# 復興まちづくり計画（松波地区）

**重点事業2**　**公民館の建替えや運用変更による多世代の交流の場づくり**

秋吉、不動寺公民館の建替えと合わせて、地域が求める機能を実現できるように工夫し、多世代のそれぞれの使い方や交流ができる場づくりを進めます。また、賑わいの創出や交流の促進に向けて、地域の意見を取り入れながら、公民館を上手に使うための周知、必要に応じた運用方法の見直しを行います。

**事業内容**

**①公民館の建替えによる地域交流の場づくり**
公民館の建替えに合わせて、地域が期待する交流の場としての使い方ができるように施設・設備の整備等について検討する。
**②地域の意見を取り入れた公民館等の運用方法の見直し**
地域で期待されている習い事教室や飲食・物販での活用など、現在の運用で可能な公民館等の使い方の周知や、地域のニーズに合わせた運用方法の見直しを行う。
**③公民館の活用によるまちづくり活動の実施**
地域主体で各公民館の活用によるマルシェの開催、地域交流イベントの開催など、まちづくり活動を実施する。

**タイムライン**

| 項目 | 復旧期(R6～7) | 再生期(R8～10) | 創造期(R11～14) |
|---|---|---|---|
| ①公民館の建替えによる地域交流の場づくり | 地域の意見聴取<br>公民館建替え設計 | 公民館建替え工事<br>（秋吉、不動寺） | |
| ②地域の意見を取り入れた公民館等の運用方法の見直し | 地域の意見聴取、活用方法の周知・運用見直し | | |
| ③公民館の活用によるまちづくり活動の実施 | まちづくり活動の実施 | | |

**役割**

**①公民館の建替えによる地域交流の場づくり**
【行政】地域の意見を取り入れた交流のための施設・設備、広場等の整備　【地域】公民館建替えに向けた検討への参加
**②地域の意見を取り入れた公民館等の運用方法の見直し**
【行政】】地域が期待する使い方の実現に向けた運用ルールの見直し
【地域】公共施設の使い方、利用主体、費用負担等に関する意見の整理
**③公民館の活用によるまちづくり活動の実施**
【行政】地域主体のまちづくり活動への支援　【地域】マルシェ・地域交流イベント等の開催


秋吉公民館

**今後の方針**

【教育委員会事務局】
①②公民館運営審議委員など、地域の意見を聞き、完成後の利活用をイメージしながら整備を進める。
③活性化事業など地域の特色を生かした事業を展開し、地域活動を活性化する。

# 復興まちづくり計画（農・松波地区）

## 重点事業３　海辺の資源を活かしたレクリエーション環境整備

恋路海岸や五色ケ浜の海水浴場や良好な景観を有する海辺の観光資源を活かして、さらに多様なアクティビティを提供できる環境の整備、海辺の地域における民間事業者等によるサービスの提供等によって、交流・関係人口の獲得を目指します。

### 事業内容

**①恋路海岸、五色ケ浜等の海水浴場の改修**
被災した海水浴場の改修等により、海水浴場の再開、利用者の利便性・快適性を向上する。
**②海辺ルートのサイクルツーリズムの活性化**
国・県の能登半島絶景街道の取組と連携してサイクルツーリズムの活性化を進める。
**③海辺の公共空間（漁港用地等）の活用**
漁港の復旧後に海辺の公共空間の民間活用によりマルシェの開催やアクティビティの提供等の新たな賑わいスポットの形成を図る。

### タイムライン

| 項目 | 復旧期(R6～7) | 再生期(R8～10) | 創造期(R11～14) |
|---|---|---|---|
| ①恋路海岸、五色ケ浜等の海水浴場の改修 | 海水浴場の改修 | | |
| ②海辺ルートのサイクルツーリズムの活性化 | 国・県の取組への参画 | | 海辺ルートの整備、サイクルツーリズムの活性化 |
| ③海辺の公共空間（漁港用地等）の活用 | 公共空間活用の仕組みづくり | 公共空間の民間活用の試行 | |

### 役割

**①恋路海岸、五色ケ浜等の海水浴場の改修**
【行政】海水浴場の改修
**②海辺ルートのサイクルツーリズムの活性化**
【行政】国・県の能登半島絶景街道の取組と連携　【地域】民泊等によるサイクルツーリズムの受入れ環境づくり
**③海辺の公共空間（漁港用地等）の活用**
【行政】公共空間（漁港用地等）の民間活用を可能にする仕組みの検討
【地域】海辺の賑わいを創出する公共空間活用の試行


五色ヶ浜


恋路海岸

### 今後の方針


【ふるさと振興課】
①五色ヶ浜海水浴場については、通常どおり営業を再開しており、引き続き利用者が安全・快適に利用できるよう、適切な維持管理に努める。
恋路海岸については、令和8年度に災害復旧工事を発注しており、工事の進捗を適切に管理しながら、海水浴場の再開に向けた復旧・整備を進める。
【建設水道課】
②サイクリングルート整備は令和9年度より事業再開
【農林水産課】
③いずれも目的外使用になるので「漁業者への理解」が必要。また、長期的な用途変更の場合は「水産庁への利用計画変更」が必要。

# サイクリングルート事業について

石川県内には「いしかわ里山里海サイクリングルート」として、7つのサイクリングルートがあり、令和8年7月23日には、同ルートがナショナルサイクルルートとして国から指定を受けました。

今後は、この指定を新たなスタートとして、県や市町、関係団体が協力して、より安全で快適な走行環境の整備や地域の魅力を感じられるような立寄施設・おもてなしの充実に取り組んでいきます。

（町として整備するのは約14.2kmです）

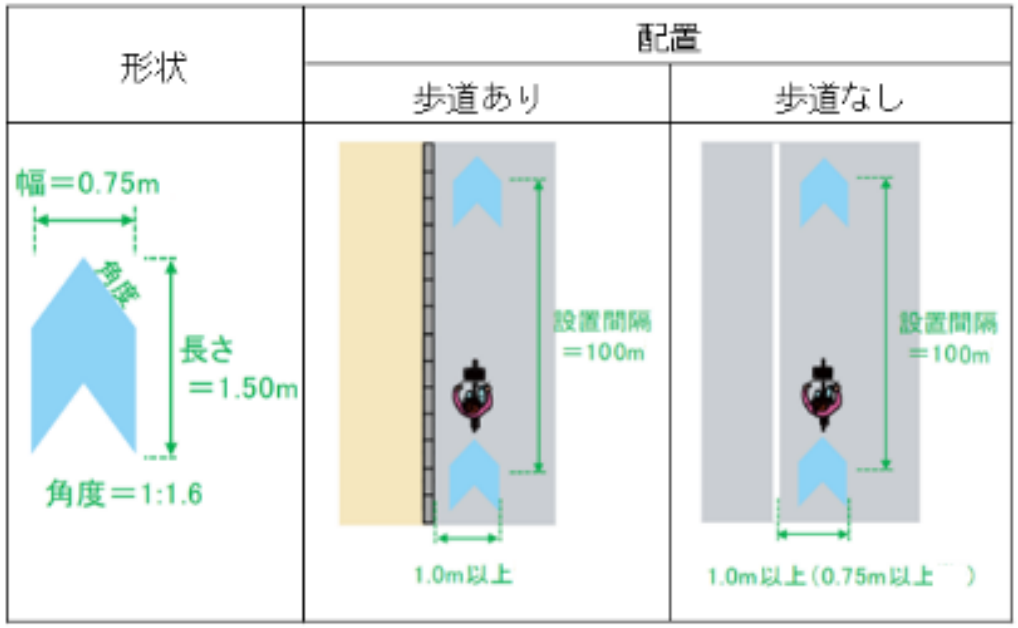


○事業のポイント

・自転車で地域の観光資源を巡る新たな観光ルートをつくる


・安全に走行できる道路環境を整備する

・案内表示（日英2か国語標記）や休憩場所などを充実させる

・サイクリストを受け入れる地域の体制を整える

・観光振興と地域経済の活性化につなげる


町のサイクリングルート整備の取り組み（矢羽根等）は右図のとおり

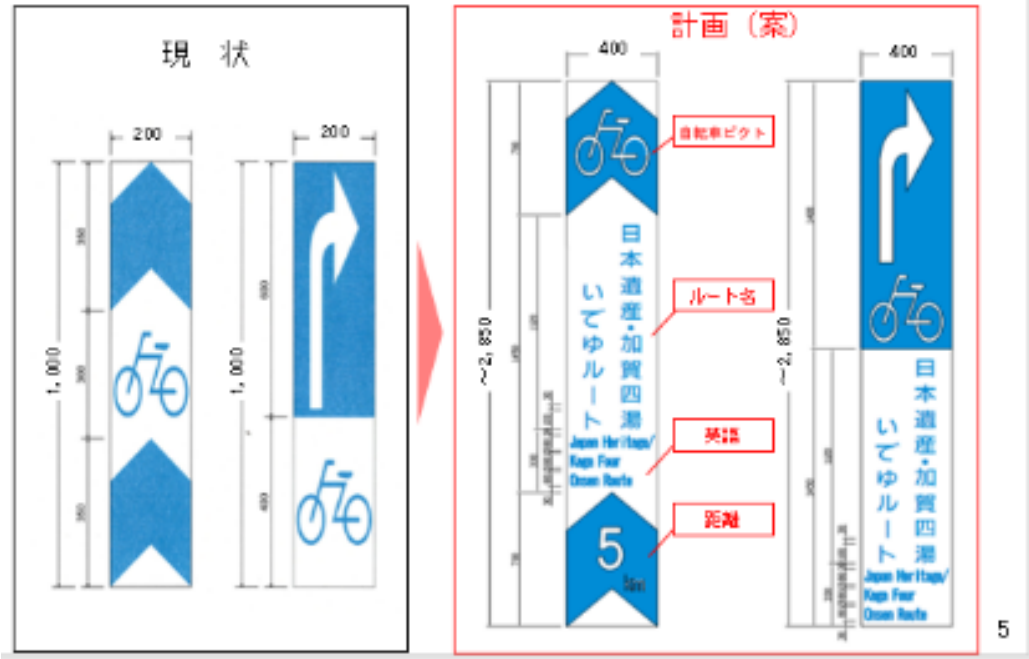


参照：「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」より

# 意見交換

## 03 地区別復興まちづくり計画 主要事業の進捗について

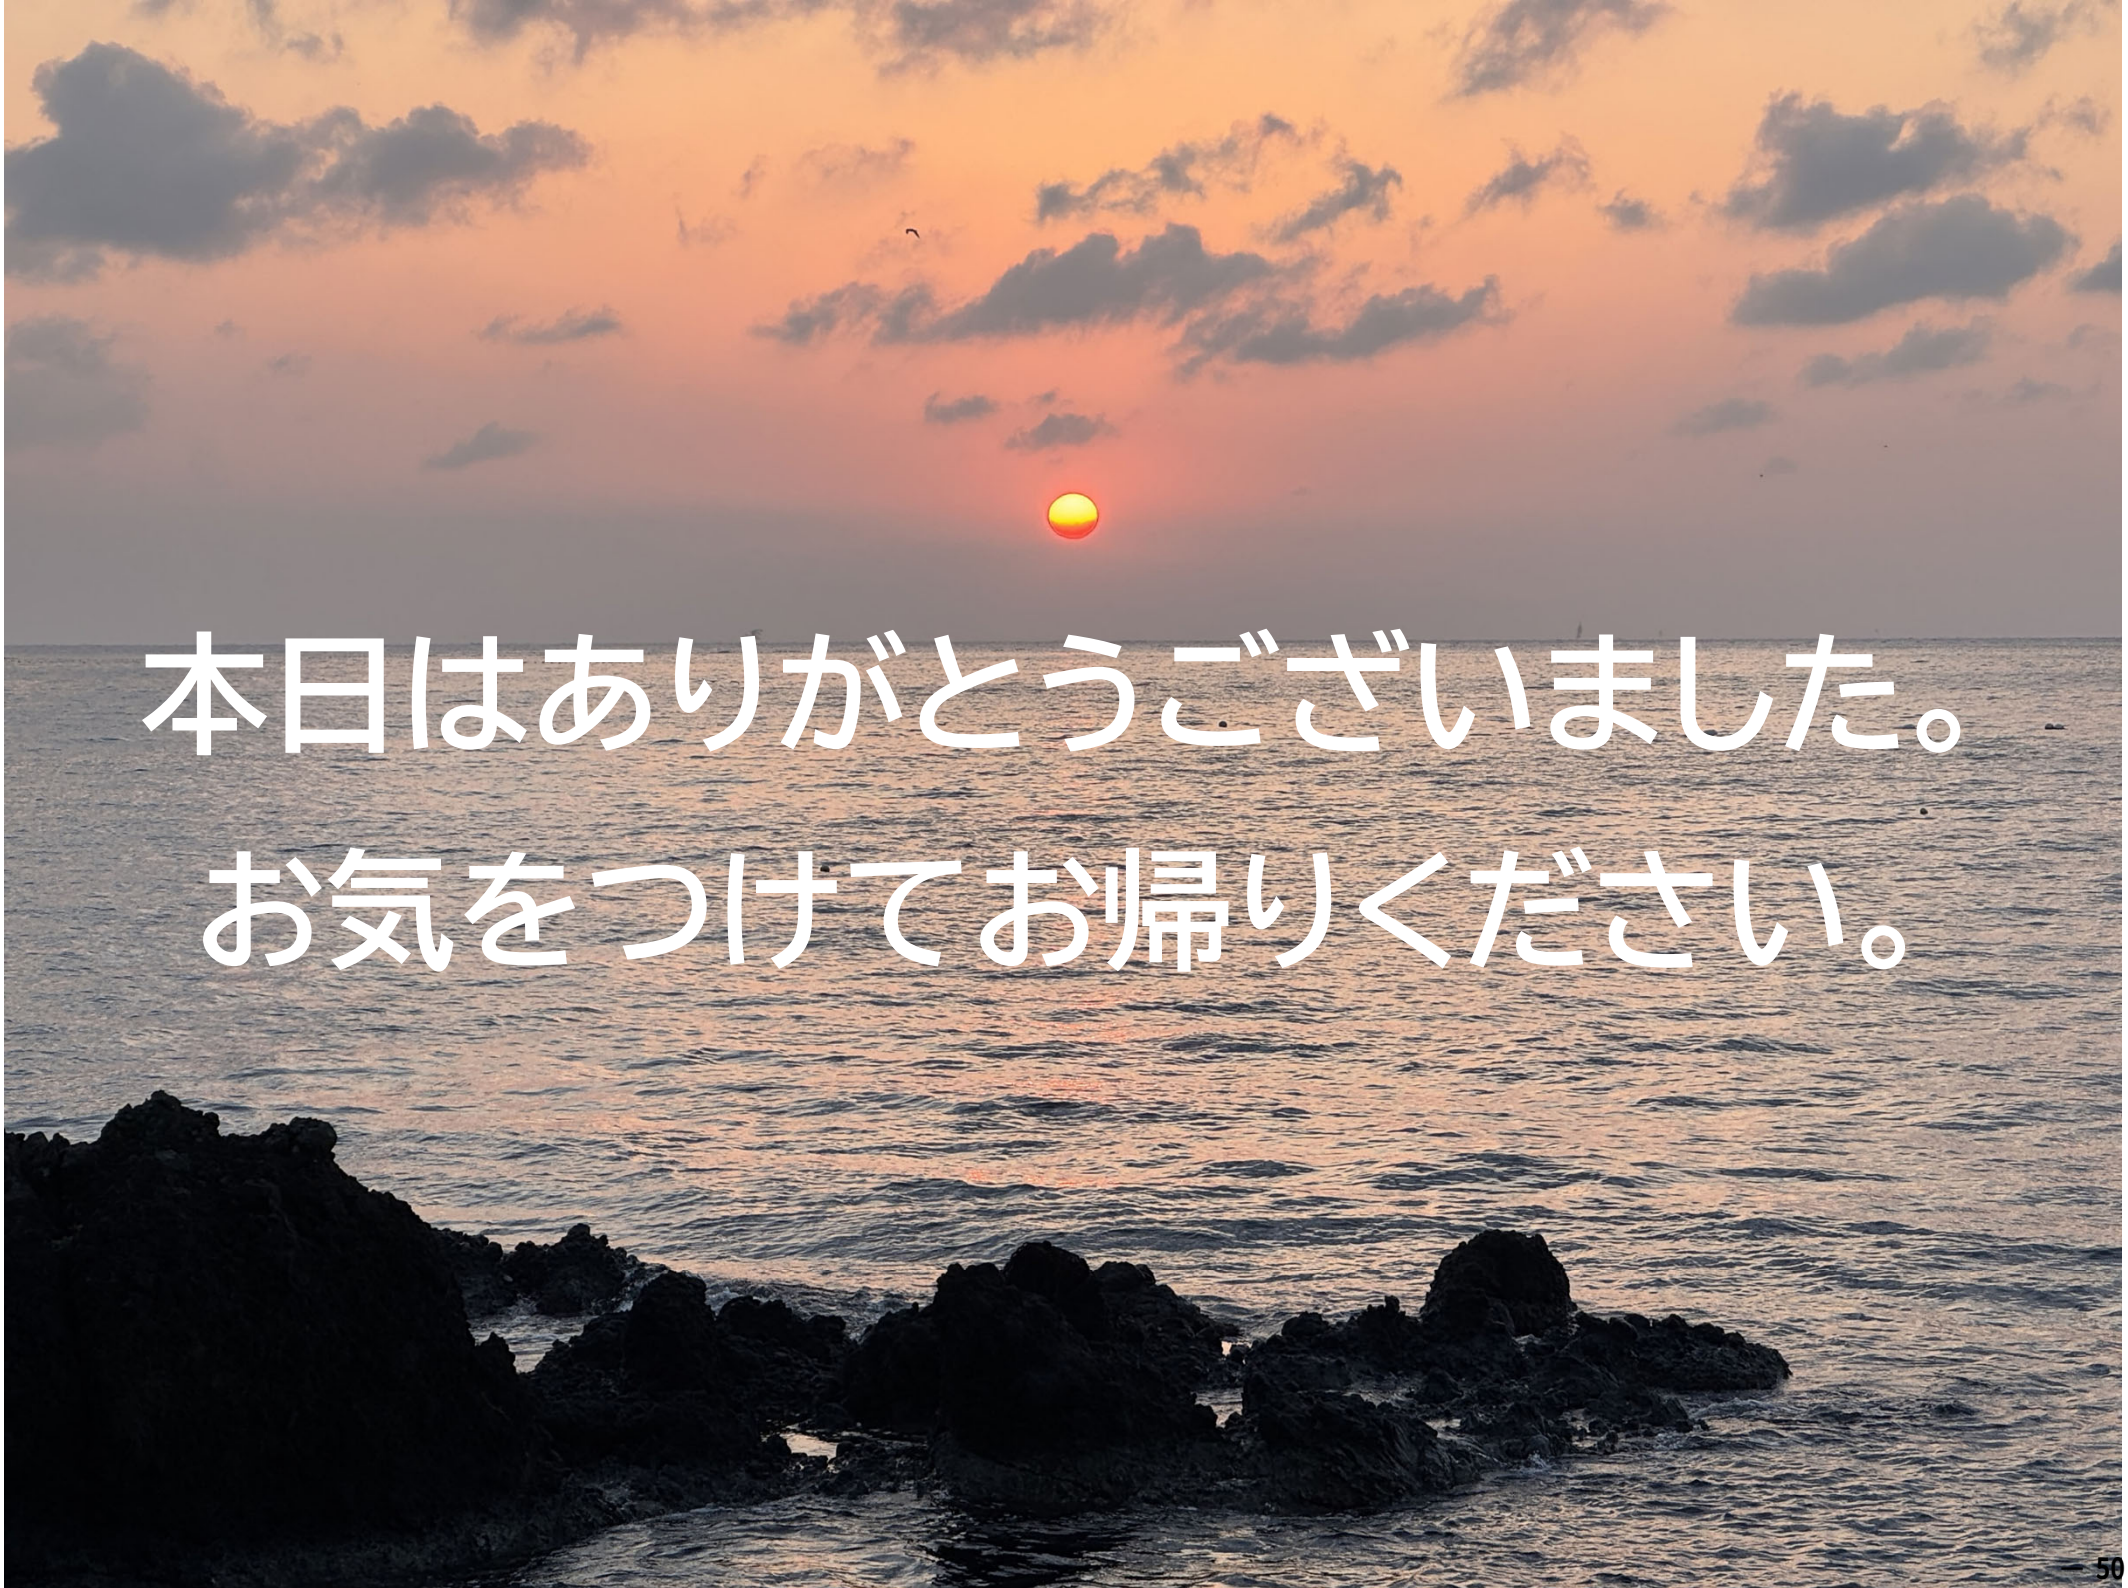
本日はありがとうございました。
お気をつけてお帰りください。
